

---

## 340 Umbau Wisenthalle und Aufstockung Bibliothek 18.12.2020 MB

---

### Schlussbericht

---

#### Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Beschrieb
3. Planunterlagen
4. Baukosten
5. Fotos



## I. Einleitung

Im Juli 2013 wurde die Schneider Gmür Architekten AG beauftragt, ein Sanierungskonzept für die im Jahr 1986 in Betrieb genommene Wisenthalle auszuarbeiten. Schon da wurden zum Teil erhebliche Mängel in Bezug auf die Brandschutzvorschriften festgestellt und man um eine umfassende Sanierung nicht herumkommen wird. Die erste Kostenschätzung betrug CHF 3.1 Mio. Im Mai 2014 wurde für die Festlegung der künftigen Entwicklung der Bibliothek eine Arbeitsgruppe gebildet. Die Renovation der Wisenthalle bot eine gute Gelegenheit für eine Bibliotheks-erneuerung und –Erweiterung. Im September 2014 hat der Gemeinderat dem Konzept „Bibliothek 2035“, einer Erweiterung und Erneuerung für eine zeitgemässe Nutzung, zugestimmt. Das Projekt basierte damals auf einem Ausbau des Dachstocks und des Logopädieraumes. Am 12. Januar 2015 hat der Gemeinderat dem Projekt der Schneider Gmür Architekten mit dem Bibliotheksausbau im Dachstock zugestimmt und zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet. Am 14. Juni 2015 wurde an der Urnenabstimmung einerseits der Sanierung der Wisenthalle über CHF 4'131'700 und andererseits der Bibliothekserweiterung über CHF 1'414'400 zugestimmt. In Anbetracht der Höhe der Bausumme mussten die weiteren Architekturleistungen im offenen Verfahren ausgeschrieben werden. Am 15. Juni 2015, einen Tag nach der Abstimmung, wurden die Architekturleistungen dem Erstrangierten, der omg+partner Architekten AG (heute Nachfolgeunternehmung RLC Architekten AG) vergeben. Beim Studium und der Bearbeitung der durch Schneider Gmür Architekten abgegebenen Unterlagen musste festgestellt werden, dass der vorgesehene Baubeginn im März 2016 für die geplanten Sanierungsarbeiten, inklusive Erweiterung der Bibliothek im Dachgeschoss nicht eingehalten werden kann.

Es wurde festgestellt:

- Die vorliegenden Unterlagen zum Brandschutz beinhalten Mängel und basieren auf den Brandschutzvorschriften von 2003/2005.
- Der Einbau der Bibliothek über der Mehrzweckhalle ohne kostenintensive Zusatzmassnahmen ist nicht realisierbar.

Nachdem definitiv feststand, dass der Einbau der Bibliothek im Dachboden unter Berücksichtigung der neuen Brandschutzvorschriften zu massiven Mehrkosten führen würde, hat der Gemeinderat weitere Varianten in der Wisenthalle in Auftrag gegeben.

Aus den verschiedenen Varianten in der Wisenthalle entschied sich der Gemeinderat für die kostengünstigste Variante, die Anhebung des Daches am heutigen Standort der Bibliothek. Damit war es möglich, am bestehenden Ort ein zusätzliches Geschoss einzubauen, der wichtige Bezug zur Schule bleibt erhalten. Mit dieser Variante konnte der Brandschutz einfach entflechtet werden und die Endnutzfläche für den Betrieb der Bibliothek wurde als eher besser beurteilt.

Das Architekturbüro RLC, Winterthur, wurde Mitte März 2016 vom Gemeinderat beauftragt, die Aufstockung auszuarbeiten. Gemäss Kostenvoranschlag vom 6. April 2017 betragen die Kosten für die Aufstockung der bestehenden Bibliothek und dem Ausbau des Logopädiezimmers CHF 1'803'000. Der bereits bewilligte Kredit vom 14. Juni 2015 betrug CHF 1'414'000. Der Zusatzkredit über CHF 388'600 wurde an der Urnenabstimmung vom 24. September 2017 verabschiedet.

Der gesamte Investitionskredit für die Sanierung der Wisenthalle und der Aufstockung der Bibliothek beträgt somit CHF 4'131'700.- plus 1'803'000.- Total 5'934'700.- inkl. MwSt.

## 2. Beschrieb

Bereits mit GRB vom 18. April 2016 wurde der Sanierungsbeginn auf März 2019 bis 31. Dezember 2019 verschoben.

Der Baustart erfolgte pünktlich nach dem Fasnachtsball am 4. März 2019 und konnte im Januar 2020 unfallfrei abgeschlossen werden.

### BKP 1 Vorbereitungsarbeiten

In der Bauvorbereitung wurden Aufnahmen zur Analyse der Bausubstanz gemacht. Es musste aufgrund der Ergebnisse kein belastetes Material speziell abgeführt werden.

Als Vorbereitung für die baulichen Arbeiten wurde die bestehende Bibliothek abgebrochen bis auf den Boden im Obergeschoss. Im Bereich der Wisenthalle wurden die alten Decken, Türen, Abschlüsse, Sanitärapparate und einiges mehr zurückgebaut.

### BKP 211 Baumeisterarbeiten

Aufgrund der zusätzlichen Lasten im Bereich der Bibliothek mussten statische Massnahmen wie zum Beispiel neue Stützen und betonierte Wandscheiben im Untergeschoss erstellt werden. Diverse Durchbrüche für die Haustechnik wurden erstellt, teilweise mit Verstärkungsmassnahmen wie Klebarmierungen. In der Tiefgarage wurde eine neue Brandschutzwand errichtet. Daneben mussten viele kleinere Arbeiten im Zusammenhang mit den übrigen Gewerken erledigt werden.

#### BKP 211.1 Gerüste

Für die Aufstockung und den Arbeiten am Dachrand sowie der Fassade wurde ein Fassadengerüst erstellt. Im Inneren der Wisenthalle wurde zudem ein Flächengerüst errichtet, damit die Arbeiten an der Decke vorgenommen werden konnten.

### BKP 214 Montagebau in Holz

Wände, Zwischenboden und Dächer für die Vergrösserung der Bibliothek wurden in vorfabrizierter Holzbauweise geplant. Im Bestand wurden ausserdem diverse neue Dachfenster eingebaut, teilweise wegen Anforderungen an den Brandschutz als sogenannte Rauch- und Wärmeabzugsöffnungen.

### BKP 221 Fenster, Aussentüren, Tore

Die komplette Fensterfassade der Turnhalle wurde zurückgebaut. Stehen geblieben sind nur die statischen Stützen. Neue, qualitativ hochwertige Holzmetallfenster wurden als Ersatz erstellt. Fluchttüren ermöglichen im Notfall eine schnelle Evakuierung der Halle und den Einsatz von Brandlüftern, um den Rauch wegzubringen.

Für den Bibliotheksneubau wurden auch neue Holzmetallfenster montiert.

Beim Eingang und im Foyer wurden neue Türabschlüsse erstellt. Eine neues brandfallgesteuertes Schiebetor in der Garage vervollständigt den Brandabschnitt in diesem Bereich.

### BKP 222 Spenglerarbeiten

Die komplette Gebäudehülle des Neubauteils wurden mit rautenförmigen Schindeln aus Zink eingekleidet. Die Zweifarbigkeit, welche alle Dächer und Wände umfasst, ergibt eine schöne Homogenität der Hülle.

Daneben wurde das neue Dach mit einer vorschriftsmässigen Absturzsicherung für die Dacharbeiten ausgestattet. Ebenso wurde der Blitzschutz angepasst und ergänzt.

#### BKP 224 Bedachungsarbeiten

Als Witterungsschutz zwischen Abbruch und Erstellung der Holzelemente musste eine Notabdichtung auf dem Boden der Bibliothek erstellt werden. An der neuen Turnhallenfassade wurden Abdichtungen im Sockelbereich sowie Glasfaserbeton-Fensterbänke benötigt.

Das Anschlüsse des Neubaus an das Dach sowie die bei den Dachfenstern mussten die Ziegel demontiert und später wieder montiert werden. Ausserdem wurde das bestehende Dach mit einer vorschriftsmässigen Absturzsicherung für Dacharbeiten nachgerüstet.

#### BKP 225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen

In der Tiefgarage wurde die gesamte Decke mit einer Mineralwolldämmung ausgestattet. Ausserdem musste Brandschutzbekleidungen erstellt und viele Durchbrüche mit Brandschottungen versehen werden. Bei neuen Bauteilen wurden zudem neue Kittfugen erstellt werden.

#### BKP 226 Fassadenputze

Die Betonstütze der Turnhallenfassade wurde nachgedämmt und neu verputzt.

#### BKP 227 Äussere Oberflächenbehandlungen

Die bestehenden Fassaden wurden örtlich geflickt und neu gestrichen. Ebenso wurde ein neuer Anstrich auf die Dachuntersichten angebracht.

#### BKP 228 Sonnenschutz

Bei den grossen Fenstern der Bibliothek sowie der Turnhallenfassade wurden aussenliegende Stoffstoren montiert. Diese sind automatisch, mittels Wetterstation, gesteuert, lassen sich aber auch per Knopfdruck heben und senken.

#### BKP 23 Elektroanlagen

Die Elektroanlagen des gesamten Gebäudes (ausser Hauswartwohnung) wurden ersetzt und die neuen Installationen angeschlossen. Die Hauptverteilung im Untergeschoss wurde auch ersetzt.

Bibliothek und Wisenthalle sowie alle dazugehörigen Räume wurden mit einer Notlichtanlage ausgestattet. Die Notlicht- sowie die RWA-Zentrale befinden sich neu in einem Raum im UG.

Die Beleuchtung wurde komplett erneuert nach einem neuen Beleuchtungskonzept. Es wurden überall energiesparende LED-Leuchten eingesetzt.

Der Aussenbereich wurde auch mit neuer Beleuchtung ausgestattet.

#### BKP 243 Wärmeverteilung

In der Bibliothek wurden neue Heizkörper montiert. Die übrige Heizungsverteilung wurde punktuell angepasst und ergänzt, wo nötig. Ausserdem wurde die Bodenheizung gespült, um die Verdrückung zu entfernen und sie wieder leistungsfähiger zu machen.

#### BKP 244 Lüftungsanlagen

Die Lüftungsgeräte (Monoblöcke) wurden komplett abgebrochen und es wurden neue Geräte installiert. Das Lüftungskonzept wurde zum grössten Teil angepasst und neu erstellt. Die Lüftung für die Turnhalle wurde komplett neu verlegt.

#### BKP 250 Sanitäranlagen Gebäude



Die Sanitärleitungen wurden komplett saniert. Apparate und Garnituren der Nasszellen wurden ersetzt. Teilweise waren Anpassungen am Verteilsystem nötig.

#### BKP 258 Kücheneinrichtungen

Die Gastküche wurde für den Umbau demontiert und im Untergeschoss zwischengelagert. Anschliessend wurden die bestehenden Teile und Geräte wieder montiert. Wegen eines Diebstahls mussten einige Chromstahlteile neu geliefert werden. Diese wurden von der Versicherung rückvergütet.

Die Bibliothek hat neu eine kleine Teeküche.

#### BKP 261 Aufzüge

Um die Rollstuhlgängigkeit gemäss Gesetz zu gewährleisten, wurde innerhalb der Bibliothek ein neuer Plattformlift mit drei Haltestellen errichtet.

#### BKP 271 Gipsarbeiten

Im Bestand wurden die Verputze an Wänden ausgebessert und ergänzt. Ebenso wurden einige Decken und Dachuntersichten erstellt. Im Bibliotheksneubau wurden die Leichtbauplatten des Holzbauers gespachtelt und teilweise verputzt. Im hinteren Fluchttreppenhaus wurde eine neue Brandschutzdecke erstellt.

#### BKP 272 Metallbauarbeiten

Für die Errichtung der neuen Fensterfront der Turnhalle mussten Stahlprofile eingebaut werden. Ebenso wurden Absturzsicherungen, Abdeckungen und eine Rampe für einen Brandlüfter der Feuerwehr erstellt.

#### BKP 373 Schreinerarbeiten

Für die neue Bibliothek wurde ein Möbel mit integrierter Treppe geplant und errichtet. Ebenso wurden neue Arbeitsplätze im oberen Geschoss montiert. Ausserdem wurden diverse Arbeiten am Bestand vorgenommen und ergänzende Möbel montiert. Die Abschlüsse zu den vertikalen Fluchtwegen wurden neu erstellt. Ausserdem wurden alle Türen ersetzt.

#### BKP 274 Spezialverglasungen

Die Gläser der bestehenden Metalltüren im Geräteraum sowie im hinteren Treppenhaus wurden ersetzt.

#### BKP 275 Schliessanlagen

Das gesamte Gebäude wurde Schliesstechnisch auf den aktuellen Standard der Liegenschaften gebracht.

#### BKP 276 Innere Abschlüsse

An den schrägen Fenstern im Ideenreich wurden neue Verdunkelungsvorhänge montiert. Ebenso wurde im Foyer ein neuer Vorhang angebracht.

#### BKP 277 Elementwände

In der Turnhalle wurde eine neue Trennwand mit den aktuellen Anforderungen an Optik und Raumakustik erstellt.

#### BKP 281 Bodenbeläge

Turnhalle und dazugehöriger Geräteraum haben eine neue Nutzschicht aus PU, aufgebaut auf den bestehenden Belag, bekommen. Ebenso wurden in der Gastküche sowie den Duschen im Untergeschoss neue rutschfeste fugenlosen Bodenbeläge eingebaut. In der Bibliothek wurde ein neuer PU-Bodenbelag, im Kinderbereich ein Parkett, eingebaut. Die bestehenden Klinkerplatten der Böden wurden partiell geflickt oder ergänzt. Die Bühne sowie dazugehörigen Vorbauteile wurden komplett abgeschliffen und neu versiegelt.

#### BKP 283 Deckenbekleidungen

Im Foyer, dem Eingangsbereich der Bibliothek sowie dem Haupttreppenhaus wurde eine neue Gipsdecke, teilweise mit Akustikmassnahmen, eingebaut. Dies wurde aus brandschutztechnischer Sicht notwendig. Ausserdem wurden die Dachuntersichten in der Bibliothek mit einer Akustikdecke versehen.

Auch wegen dem Brandschutz mussten die Decke in der Turnhalle sowie dem Eingang/Foyer im Erdgeschoss ersetzt werden. Die neuen Holzdecken beinhalten jeweils auch die raumakustischen Massnahmen, die Lüftung sowie die Beleuchtung. Der Vorplatz vor dem Eingang musste ebenfalls mit feuerfesten Dachuntersichten ausgerüstet werden.

Die Decke des unteren Geschosses der Bibliothek wurde mit Faserplatten aus PET, ebenfalls mit integrierter Beleuchtung, verkleidet.

Im Untergeschoss wurden neue abgehängte Decken aus Metall erstellt.

#### BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen

Die gesamten Innenbereiche (ohne Hauswartwohnung) wurden neu gestrichen gemäss Anforderungen der Benutzer. Im Bibliotheksneubau wurde eine Glasfasertapete aufgebracht.

#### BKP 286 Bauaustrocknung

Durch den Wassereintrich während dem Umbau mussten Teilbereiche in der Wisenthalle und auf der Galerie getrocknet werden. Diese Kosten wurden von der Gebäudeversicherung zurückerstattet.

#### BKP 287 Baureinigung

Während der Bauzeit mussten mehrmals Grobreinigungen durchgeführt werden. Bei Bauende wurde alles übergeben gereinigt.

#### BKP 29

Honorare für das gesamte Projekt für sämtliche Planer, Fachplaner und Spezialisten sind in dieser Position enthalten.

#### BKP 42 Gartenanlagen

Um die Fluchtmöglichkeiten aus der Turnhalle gesetzeskonform zu gestalten, musste der entsprechende Aussenbereich angepasst und mit einem befestigten Bodenbelag versehen werden.

Ausserdem ist hier auch der Anteil der Gemeinde für den neuen Platz zwischen Wisenthalle und Schulhäusern enthalten.

#### BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskosten

Bewilligungs- und Anschlussgebühren. Kosten für Ausdrucke, Kopien und Dokumentationen. Ebenso sind hier die Kosten für Versicherungen, die Rückvergütungen sowie für das Handwerkeressen und die Baureklame enthalten.



#### BKP 7 Mehrkosten Projektüberarbeitung

Mehrkosten für Projektüberarbeitungen, welche nicht in BKP 29 enthalten sind.

#### BKP 9 Ausstattung


In der Bibliothek wurden neue Gestelle, Garderoben etc. angeschafft. Die Sportgeräte der Turnhalle wurden sanft saniert und punktuell ergänzt. Bühnentechnik und -einrichtungen wurden, inkl. Vorhänge, ersetzt. Ebenso wurde die Multimedia-Anlage neu angeschafft.

Die Signaletik im gesamten Gebäude wurde ersetzt.

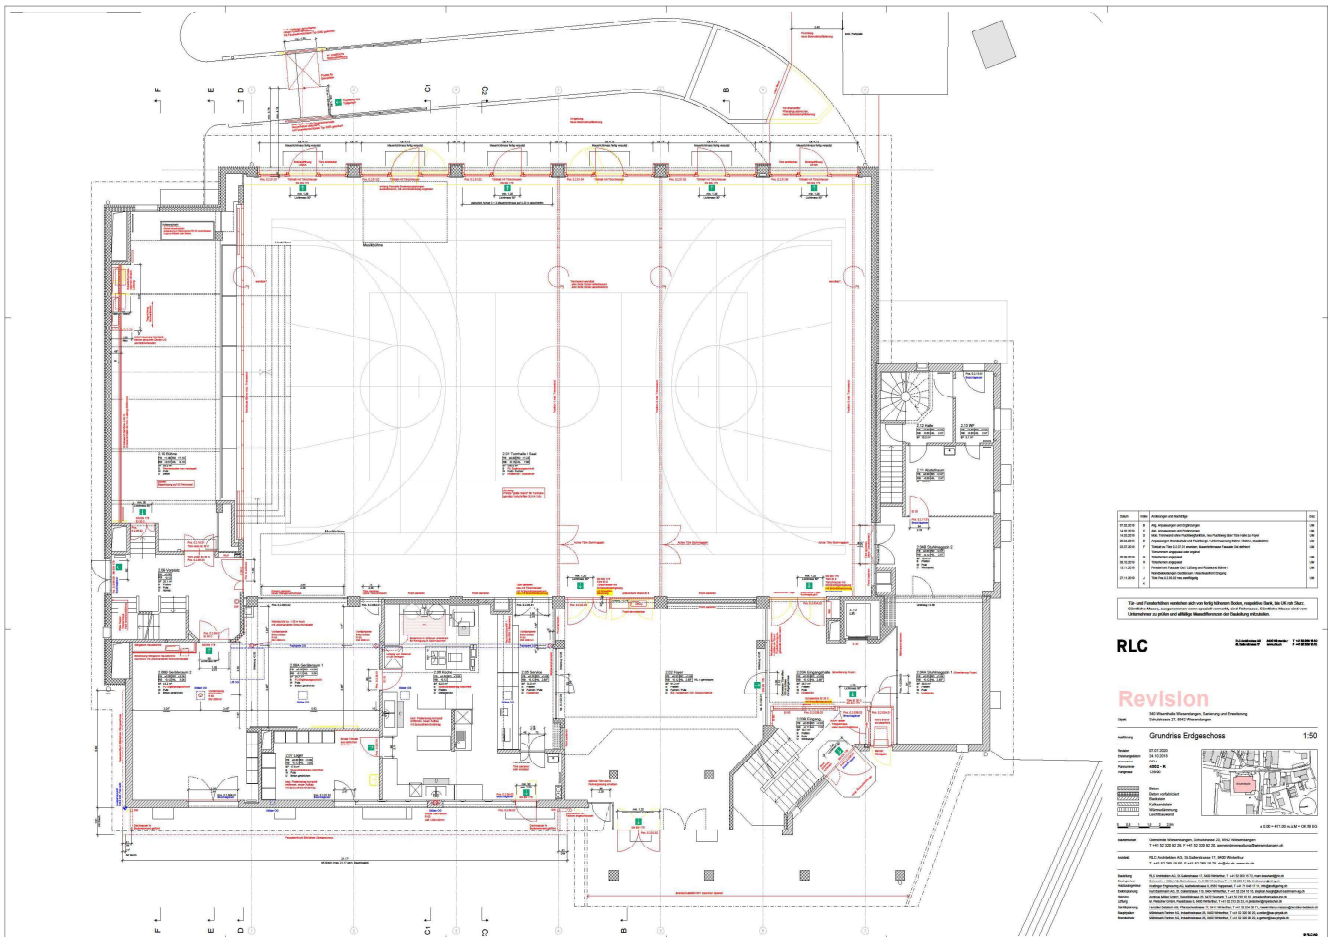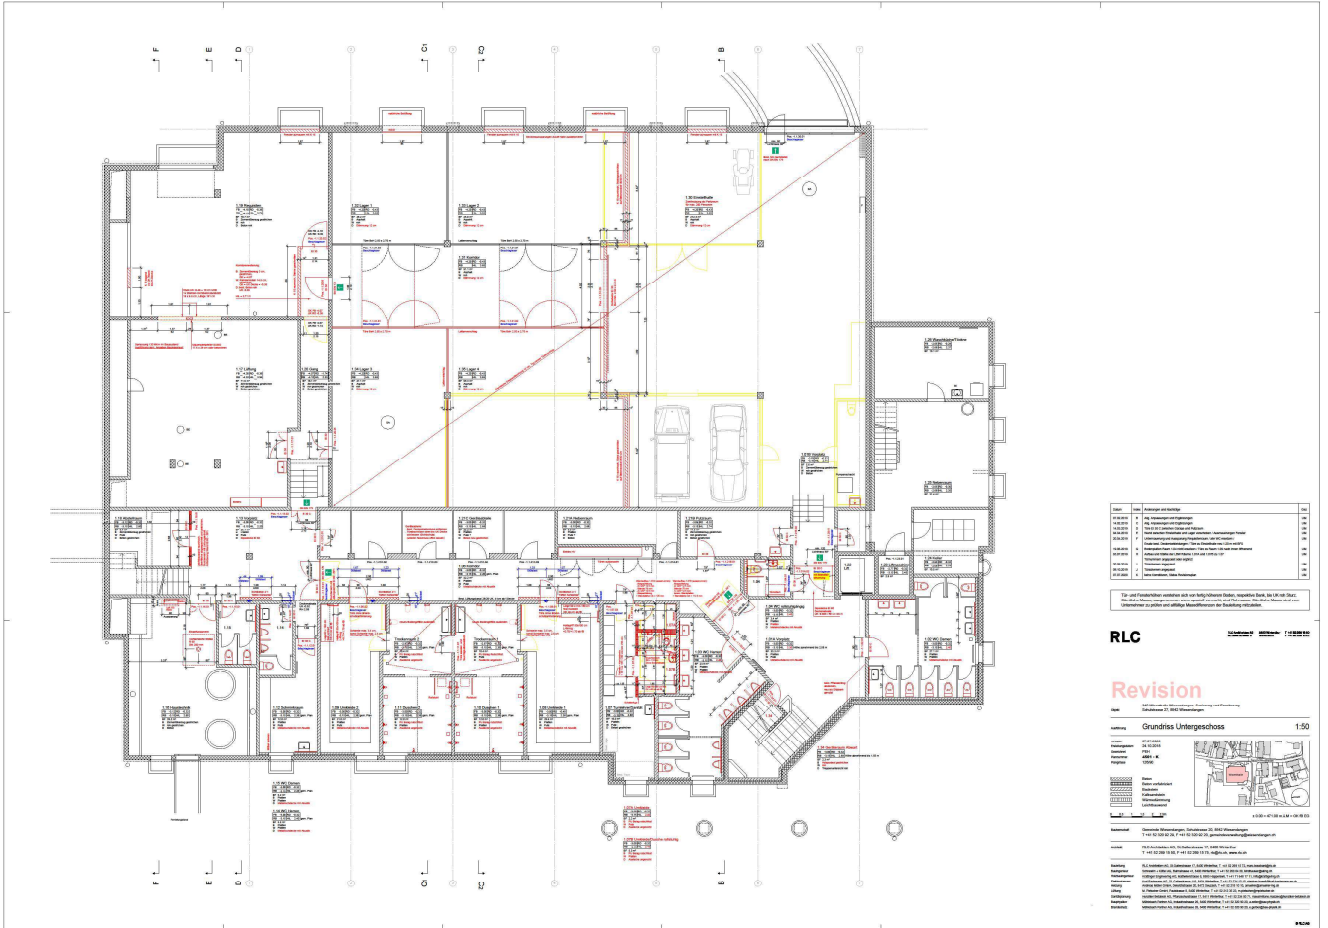







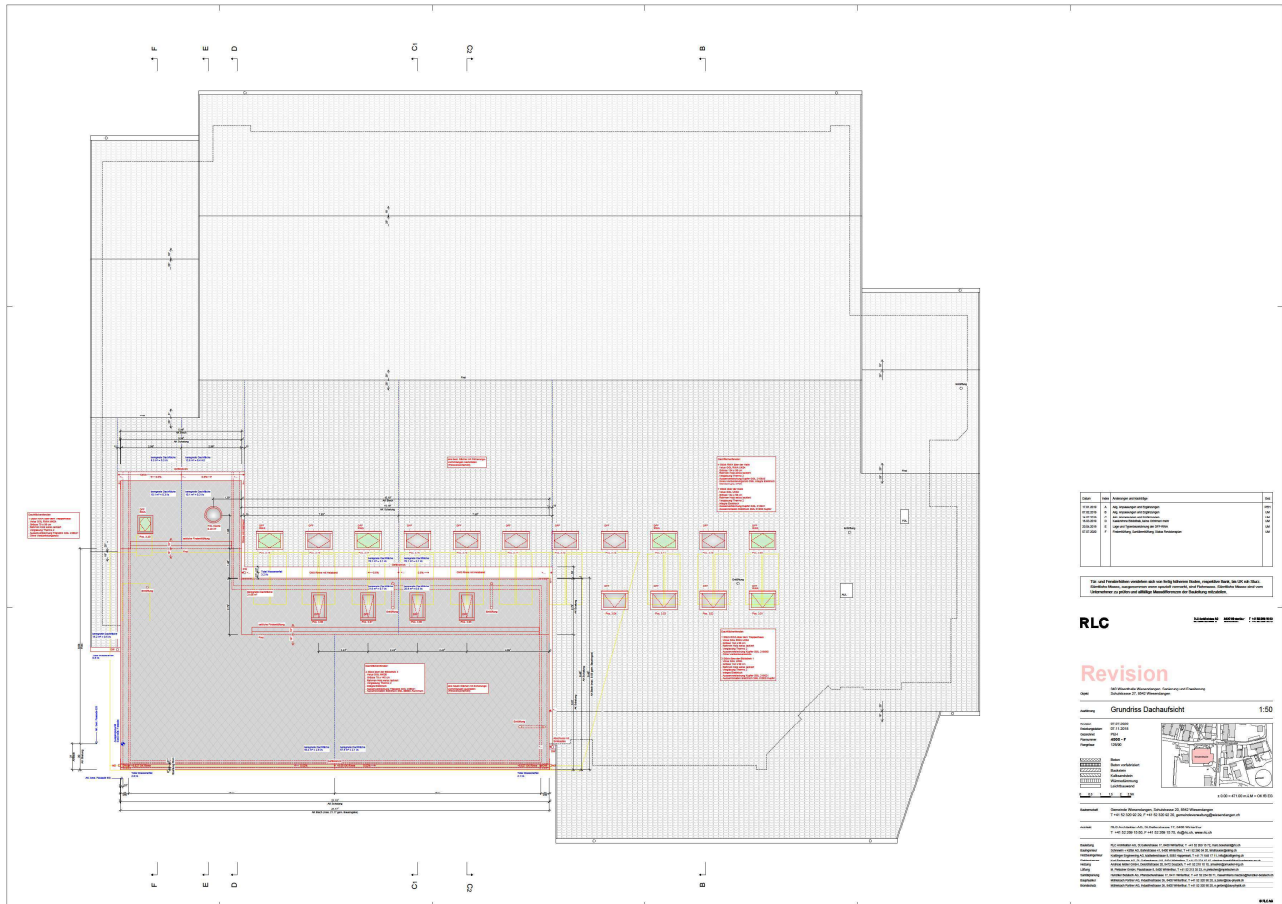







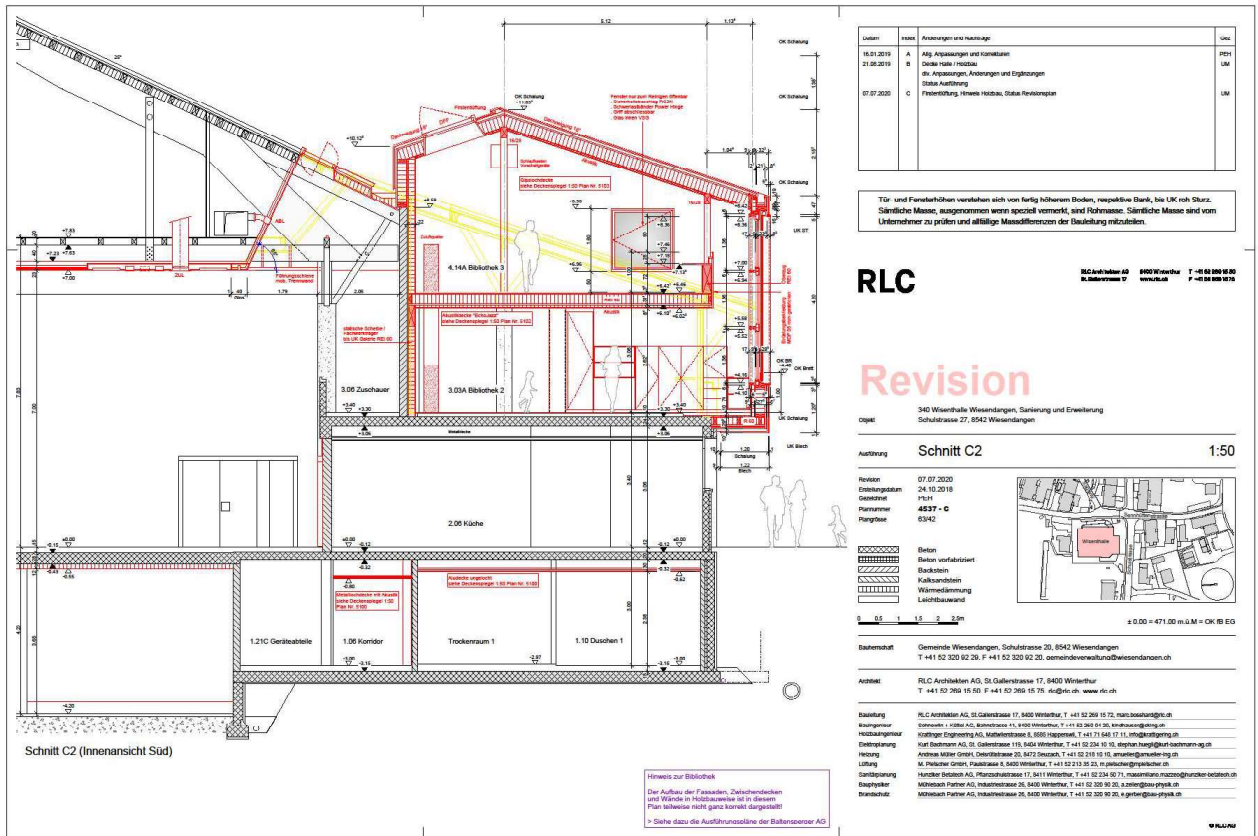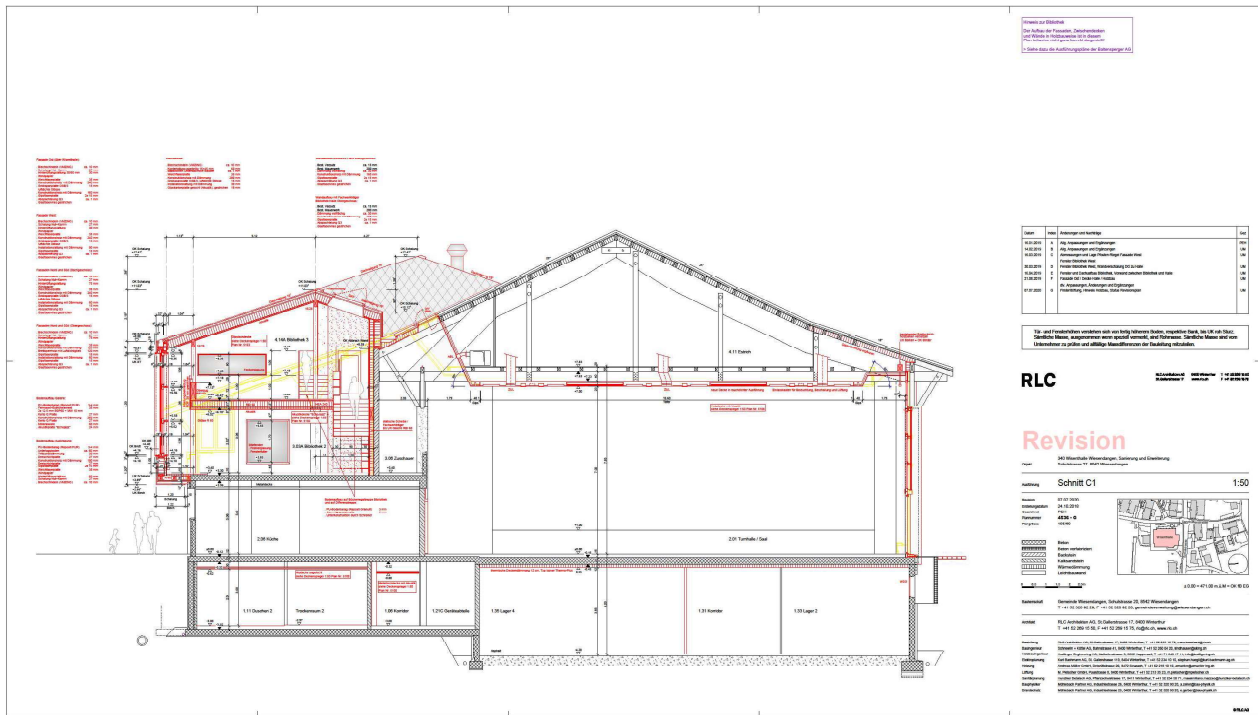







#### 4. Kosten



Projekt:                    340  
                                 Wisenthalle Wiesendangen  
Objekt:                    Sanierung und Erweiterung  
                                 Gesamtprojekt

Bauherr:                   Gemeindeverwaltung Wiesendangen, Schulstrasse 20, 8542 Wiesendangen  
Architekt:                RLC Architekten AG, St. Gallerstrasse 17, 8400 Winterthur  
Bauleitung:              RLC Architekten AG, St. Gallerstrasse 17, 8400 Winterthur

**Bauabrechnung per 09.02.2021**

Baubabrechnung per 09.02.2021

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                         |     | KV-Orig.  | KV-Rev.   | Vertrag      | Art     | Zahlung      |
|-----|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                 |     |           |           |              |         |              |
|     | Buchungstext                        | VAU | ZANW      | BU        |              | R-Datum | RA           |
|     |                                     |     |           |           |              |         |              |
| 1   | Vorbereitungsarbeiten               |     | 49'000    | 115'000   | 78'086.25    |         | 88'182.45    |
|     | GP                                  |     |           |           | 5'104.30     |         |              |
|     | WIH                                 |     | 33'000    | 70'000    | 57'802.95    |         | 68'091.80    |
|     | BIB                                 |     | 16'000    | 45'000    | 15'179.00    |         | 20'090.65    |
| 2   | Gebäude                             |     | 4'906'100 | 5'001'600 | 5'132'611.00 |         | 5'474'331.65 |
|     | WIH                                 |     | 3'431'500 | 3'541'000 | 3'706'078.75 |         | 3'915'645.00 |
|     | BIB                                 |     | 1'474'600 | 1'460'600 | 1'426'532.25 |         | 1'558'686.65 |
| 4   | Umgebung                            |     | 20'000    | 20'000    | 61'215.75    |         | 73'216.45    |
|     | WIH                                 |     | 20'000    | 20'000    | 61'215.75    |         | 73'216.45    |
| 5   | Baunebenkosten und Uebergangskonten |     | 173'400   | 289'400   | -147'281.20  |         | -124'741.60  |
|     | WIH                                 |     | 80'200    | 112'700   | -164'565.55  |         | -145'953.50  |
|     | BIB                                 |     | 93'200    | 176'700   | 17'284.35    |         | 21'211.90    |
| 6   | Brandschutz                         |     | 90'000    | 90'000    |              |         |              |
|     | WIH                                 |     | 90'000    | 90'000    |              |         |              |
| 7   | Mehrkosten Projektüberarbeitung     |     | 287'000   | 12'500    | 9'820.05     |         | 9'820.05     |
|     | WIH                                 |     | 184'800   | 8'800     | 8'263.10     |         | 8'263.10     |
|     | BIB                                 |     | 102'200   | 3'700     | 1'556.95     |         | 1'556.95     |
| 8   | Sanierung Abwartwohnung             |     | 10'000    | 10'000    |              |         |              |
|     | GP                                  |     | 10'000    | 10'000    |              |         |              |
| 9   | Ausstattung                         |     | 386'500   | 383'500   | 404'595.60   |         | 387'603.55   |
|     | WIH                                 |     | 269'500   | 266'500   | 283'764.65   |         | 266'770.45   |
|     | BIB                                 |     | 117'000   | 117'000   | 120'830.95   |         | 120'833.10   |
|     | PROJEKT TOTAL                       |     | 5'922'000 | 5'922'000 | 5'539'047.45 |         | 5'908'412.55 |
|     | GP                                  |     | 10'000    | 10'000    | 5'104.30     |         |              |
|     | WIH                                 |     | 4'109'000 | 4'109'000 | 3'952'559.65 |         | 4'186'033.30 |
|     | BIB                                 |     | 1'803'000 | 1'803'000 | 1'581'383.50 |         | 1'722'379.25 |

**Detailausdruck inkl. MWST**

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art     | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                |                                     |                                                                                                                              |                  |                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Vorbereitungsarbeiten<br>GP<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                              |                             | 49'000                         | 115'000                             | 78'086.25<br>5'104.30<br>57'802.95<br>15'179.00                                                                              |                  | 88'182.45<br><br>68'091.80<br>20'090.65                                                                       |
| 10  | Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                               |                             | 8'000<br>5'000<br>3'000        | 8'000<br>5'000<br>3'000             | 6'272.75<br>6'272.75                                                                                                         |                  | 8'190.45<br>8'190.45                                                                                          |
| 101 | Bestandesaufnahmen<br>WIH<br>10100 BKP 101 Bestandesaufnahmen<br>Ecosens AG<br>Schadstoffgutachten<br>1809 919<br><br>99999 Direktzahlung<br>GSA Becker AG \ Analyse v. Materialprobe Asbest / 25680<br>HAT-Tech AG \ Naf Tech AG \ Wasseranalyse / 4161013<br><br>BIB | 0<br>2<br><br>60<br>1       | 0<br>31<br><br>172<br>3        | 8'000<br>5'000<br><br>3'000         | 6'272.75<br>6'272.75<br>5'885.80<br><br>386.95                                                                               | A<br><br>D       | 8'190.45<br>8'190.45<br>7'803.50<br><br>2'964.20<br>f 4'839.30<br><br>386.95<br>96.95<br>290.00               |
| 11  | Räumungen, Terrainvorbereitungen<br>GP<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                   |                             | 34'000                         | 100'000                             | 71'813.50<br>5'104.30<br>51'530.20<br>15'179.00                                                                              |                  | 79'992.00<br><br>59'901.35<br>20'090.65                                                                       |
| 112 | Abbrüche<br>GP<br>11200 BKP 112 Abbrucharbeiten<br>Corti AG<br><br>WIH<br>11200 BKP 112 Abbrucharbeiten<br>Corti AG<br>1 Nachtragsofferte 1<br>1. Akonto / 683456<br>3. Akonto / 683520<br>4. Akonto / 683549<br>5. Akonto / 683865<br>Schlussrechnung / 613439        | 22<br>32<br>35<br>96<br>112 | 74<br>101<br>107<br>307<br>336 | 100'000<br><br>23'000<br><br>60'000 | 71'813.50<br>5'104.30<br>5'104.30<br>51'530.20<br>51'401.05<br>48'339.90<br>* 3061.15<br><br>196<br>225<br>233<br>517<br>565 | A<br><br>A<br>NA | 79'992.00<br><br><br>59'901.35<br>53'618.45<br><br>26'018.95<br>11'527.40<br>8'233.85<br>7'000.00<br>f 838.25 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art     |    | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|----|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |         |    |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA |         |

|       |                                                                                                                             |          |                                     |                                     |                                                    |                      |          |                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------|
| 112   | 90301 BKP 903 Bühneneinrichtung<br>Wyss Bühnenbau AG<br>3. Akonto Demontage/Entsorgung / 324694<br>Schlussrechnung / 324871 | 69       | 199                                 | 359                                 |                                                    | 26.11.19             | AC       | 6'153.75                                     |
|       |                                                                                                                             | 95       | 299                                 | 509                                 |                                                    | 20.03.20             | SR       | f                                            |
|       |                                                                                                                             | 0        | 0                                   | 644                                 | 129.15                                             | 03.06.19             | RC       | 129.15                                       |
|       |                                                                                                                             |          | 11'000                              | 40'000                              | 15'179.00                                          |                      |          | 20'090.65                                    |
|       |                                                                                                                             |          |                                     |                                     | 33'375.80<br>* -9'098.40<br>5'997.00<br>-15'095.40 |                      |          |                                              |
|       | 99999 Direktzahlung<br>Elektroanlagen und Sicherheitstechnik GmbH Reto Kunz \ Rechnung / R190533                            | 27       | 88                                  | 210                                 |                                                    | 25.04.19             | AC       | 20'090.65                                    |
|       |                                                                                                                             | 112      | 336                                 | 566                                 |                                                    | 07.08.20             | SR       | f                                            |
| 12    | Sicherungen, Provisorien<br>WIH<br>BIB                                                                                      |          | 7'000<br>5'000<br>2'000             | 7'000<br>5'000<br>2'000             |                                                    |                      |          |                                              |
| 121   | Sicherung vorhandener Anlagen<br>WIH<br>BIB                                                                                 |          | 7'000<br>5'000<br>2'000             | 7'000<br>5'000<br>2'000             |                                                    |                      |          |                                              |
| 2     | Gebäude<br>WIH<br>BIB                                                                                                       |          | 4'906'100<br>3'431'500<br>1'474'600 | 5'001'600<br>3'541'000<br>1'460'600 | 5'132'611.00<br>3'706'078.75<br>1'426'532.25       |                      |          | 5'474'331.65<br>3'915'645.00<br>1'558'686.65 |
| 21    | Rohbau 1<br>WIH<br>BIB                                                                                                      |          | 779'000<br>300'000<br>479'000       | 614'000<br>189'000<br>425'000       | 581'724.80<br>181'978.35<br>399'746.45             |                      |          | 633'320.25<br>209'501.35<br>423'818.90       |
| 211   | Baumeisterarbeiten<br>WIH<br>BIB                                                                                            |          | 225'000<br>162'000<br>63'000        | 180'000<br>109'000<br>71'000        | 136'176.60<br>92'833.25<br>43'343.35               |                      |          | 178'320.30<br>109'757.75<br>68'562.55        |
| 211.0 | Baustelleneinrichtung<br>WIH<br>21101 BKP 211 Baumeisterarbeiten<br>Corti AG<br>1. Akonto / 683457<br>2. Akonto / 683481    | 22<br>27 | 75<br>89                            | 197<br>211                          | 18'189.85                                          | AU                   |          | 20'468.90                                    |
|       |                                                                                                                             |          |                                     |                                     |                                                    | 27.03.19<br>25.04.19 | AC<br>AC | 7'410.50<br>2'058.40                         |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |     |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA      |         |

|       |                                                                                                                                                                               |                       |                          |                          |                        |    |                                              |                        |                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 211.0 | TR / 6. Akonto / 683866<br>Schlussrechnung / 613440                                                                                                                           | 96<br>112             | 308<br>342               | 518<br>574               |                        |    | 20.03.20<br>07.08.20                         | AC<br>SR               | 11'000.00<br>f                          |
| 211.1 | Gerüste<br>WIH<br>21110 BKP 211.1 Gerüste<br>Benno Erni GmbH<br>1. Akonto / 1900003<br>Teilrechnung 2. Akonto / 1900009<br>Schlussrechnung / 200199                           |                       |                          |                          | 58'444.05<br>43'408.20 | AU |                                              | 56'331.50<br>32'331.50 |                                         |
|       | BIB<br>21110 BKP 211.1 Gerüste<br>Benno Erni GmbH<br>Teilrechnung 2. Akonto / 1900009<br>3. Akonto / 1900019<br>Schlussrechnung / 200199                                      | 22<br>28<br>89        | 73<br>91<br>275          | 195<br>215<br>467        |                        |    | 21.03.19<br>09.05.19<br>21.02.20             | AC<br>AC<br>SR         | 20'000.00<br>10'000.00<br>f 2'331.50    |
|       |                                                                                                                                                                               |                       |                          |                          | 15'035.85              | AU |                                              |                        | 24'000.00                               |
|       |                                                                                                                                                                               | 28<br>75<br>89        | 92<br>215<br>275         | 216<br>382<br>468        |                        |    | 09.05.19<br>20.12.19<br>21.02.20             | AC<br>AC<br>SR         | 10'000.00<br>14'000.00<br>f             |
| 211.5 | Beton- und Stahlbetonarbeiten<br>WIH<br>21101 BKP 211 Baumeisterarbeiten<br>Corti AG<br>TR / 6. Akonto / 683866<br>Schlussrechnung / 613440                                   |                       |                          |                          | 19'894.50              |    |                                              |                        | 34'496.90<br>10'000.00                  |
|       | BIB<br>21101 BKP 211 Baumeisterarbeiten<br>Corti AG<br>4. Akonto / 683548<br>Schlussrechnung / 613440                                                                         | 96<br>112             | 308<br>342               | 519<br>578               |                        |    | 20.03.20<br>07.08.20                         | AC<br>SR               | 10'000.00<br>f                          |
|       |                                                                                                                                                                               |                       |                          |                          | 19'894.50              | AU |                                              |                        | 24'496.90                               |
|       |                                                                                                                                                                               | 35<br>112             | 106<br>342               | 232<br>576               |                        |    | 24.06.19<br>07.08.20                         | AC<br>SR               | 17'496.90<br>f 7'000.00                 |
| 211.6 | Maurerarbeiten<br>WIH<br>21101 BKP 211 Baumeisterarbeiten<br>Corti AG<br>3. Akonto / 683521<br>TR / 5. Akonto / 683586<br>TR / 6. Akonto / 683866<br>Schlussrechnung / 613440 |                       |                          |                          | 39'648.20<br>31'235.20 | AU |                                              |                        | 67'023.00<br>46'957.35                  |
|       | BIB<br>21101 BKP 211 Baumeisterarbeiten<br>Corti AG<br>TR / 5. Akonto / 683586                                                                                                | 32<br>43<br>96<br>112 | 102<br>129<br>308<br>342 | 226<br>266<br>520<br>575 |                        |    | 27.05.19<br>26.07.19<br>20.03.20<br>07.08.20 | AC<br>AC<br>AC<br>SR   | 25'607.35<br>4'350.75<br>16'999.25<br>f |
|       |                                                                                                                                                                               |                       |                          |                          | 8'413.00               | AU |                                              |                        | 20'065.65                               |
|       |                                                                                                                                                                               | 43                    | 129                      | 267                      |                        |    | 26.07.19                                     | AC                     | 8'000.00                                |



Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung<br>Objekt/Auftrag/Unt.<br>Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | KV-Orig.                      | KV-Rev.                       | Vertrag                                                                                                            | Art | R-Datum        | Zahlung                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VAU                               | ZANW                          | BU                            |                                                                                                                    |     | RA             |                                                        |
| 211.6 | Schlussrechnung / 613440                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112                               | 342                           | 577                           |                                                                                                                    |     | 07.08.20       | f 12'065.65                                            |
| 214   | Montagebau in Holz<br>WIH<br>21400 BKP 214 Holzbau<br>Baltensperger AG<br>3 Nachtrag Dämmung Dach Turnh.<br>4 Nachtrag Dachdämmung<br>5 Nachtrag Rückwand Bühne<br>6 Nachtrag Brandschutzdecke<br>7 Nachtrag Treppe unter Bühne<br>Rückbau NT2 / 12360<br>TR / 4. Akonto<br>Schlussrechnung / 12575 | 43<br>76<br>106                   | 554'000<br>138'000            | 434'000<br>80'000             | 445'548.20<br>89'145.10<br>56'881.50 A<br>9'348.80 NA<br>7'431.70 NA<br>12'405.25 NA<br>1'358.15 NA<br>1'719.70 NA |     |                | 454'999.95<br>99'743.60                                |
|       | BIB<br>21400 BKP 214 Holzbau<br>Baltensperger AG<br>2 Nachtrag Abbrucharbeiten<br>1. Akonto<br>Rückbau NT4 / 12359<br>2. Akonto<br>3. Akonto<br>TR / 4. Akonto<br>Schlussrechnung / 12575                                                                                                           | 37<br>43<br>43<br>55<br>76<br>106 | 416'000                       | 354'000                       | 356'403.10<br>338'474.30 A<br>17'928.80 NA                                                                         |     | RC<br>AC<br>SR | 22'284.55<br>45'000.00<br>f 32'459.05<br>355'256.35    |
| 214.1 | Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 554'000<br>138'000<br>416'000 | 434'000<br>80'000<br>354'000  |                                                                                                                    |     |                |                                                        |
| 22    | Rohbau 2<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 640'000<br>379'500<br>260'500 | 562'000<br>337'500<br>224'500 | 651'863.40<br>417'112.00<br>234'751.40                                                                             |     |                | 622'582.50<br>391'876.55<br>230'705.95                 |
| 221   | Fenster, Aussentüren, Tore<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 204'000<br>155'000<br>49'000  | 279'000<br>207'000<br>72'000  | 327'341.75<br>258'988.70<br>68'353.05                                                                              |     |                | 297'237.90<br>235'537.90<br>61'700.00                  |
| 221.1 | Fenster aus Holz/Metall<br>WIH<br>22100 BKP 221 Fenster<br>EgoKiefer AG<br>Schlussrechnung / 1276579                                                                                                                                                                                                | 73                                | 184'000<br>135'000            | 224'000<br>158'000            | 219'690.60<br>155'988.05<br>154'267.55 AU                                                                          |     |                | 205'161.70<br>143'461.70<br>141'741.20<br>f 141'741.20 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                     |                      | KV-Orig.                 | KV-Rev.                  | Vertrag                                      | Art                  | R-Datum                                      | Zahlung                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |                          |                                              |                      |                                              |                                                    |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                    | VAU                  | ZANW                     | BU                       |                                              |                      | RA                                           |                                                    |
| 221.1 | 99999 Direktzahlung<br>Lenobag AG \ Scherenbühne                                                                                                                                                                                                | 80                   | 237                      | 410                      | 1'720.50                                     | D                    | 11.02.20                                     | 1'720.50<br>1'720.50                               |
|       | BIB<br>22100 BKP 221 Fenster<br>EgoKiefer AG<br>1. Akonto / 1258611<br>Schlussrechnung / 1276579                                                                                                                                                |                      | 49'000                   | 66'000                   | 63'702.55                                    | AU                   |                                              | 61'700.00                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 42<br>73             | 124<br>209               | 261<br>365               |                                              |                      | 18.07.19<br>05.12.19                         | 61'700.00<br>f                                     |
| 221.5 | Aussentüren, Tore aus Holz<br>WIH<br>22150 BKP 221.5 Aussentüren, Tore aus Holz<br>Fehr AG Robert<br>1 Türen Fassade Turnhalle<br>1. Akonto / 2019571<br>Schlussrechnung / 2020048                                                              |                      | 20'000<br>20'000         | 45'000<br>39'000         | 98'701.70<br>94'051.20                       |                      |                                              | 83'126.75<br>83'126.75                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 72<br>91             | 205<br>283               | 371<br>483               | 47'667.00<br>46'384.20                       | AU<br>NA             | 13.12.19<br>27.02.20                         | 43'080.00<br>f 40'046.75                           |
|       | BIB<br>22150 BKP 221.5 Aussentüren, Tore aus Holz<br>Fehr AG Robert<br>Schlussrechnung / 2020048                                                                                                                                                | 0                    | 0                        | 484                      | 4'650.50<br>4'650.50                         | AU                   | 27.02.20                                     | f                                                  |
| 221.6 | Aussentüren, Tore aus Metall<br>WIH<br>22161 BKP 221.6 Tore aus Metall<br>Stawin AG<br>Schiebotor / 4056422                                                                                                                                     |                      |                          | 10'000                   | 8'949.45                                     | A                    |                                              | 8'949.45                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 96                   | 309                      | 521                      |                                              |                      | 27.03.20                                     | 8'949.45                                           |
| 222   | Spenglerarbeiten<br>WIH<br>22200 BKP 222 Spenglerarbeiten<br>Scherrer Metec AG<br>Schlussrechnung / 607773                                                                                                                                      |                      | 137'500<br>17'500        | 140'000<br>17'500        | 150'986.40<br>14'606.60                      |                      |                                              | 168'000.00<br>28'000.00                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 73                   | 211                      | 377                      | 14'606.60                                    | AU                   | 07.12.19                                     | f 28'000.00                                        |
|       | BIB<br>22200 BKP 222 Spenglerarbeiten<br>Scherrer Metec AG<br>1 Nachtrag Blechwanne Lift<br>2 Nachtrag Schneefang Absturz.<br>3 Mehrkosten Muster<br>1. Akonto / 800710<br>2. Akonto / 800743<br>3. Akonto / 800760<br>Schlussrechnung / 607773 |                      | 120'000                  | 122'500                  | 136'379.80                                   |                      |                                              | 140'000.00                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 40<br>48<br>52<br>73 | 118<br>139<br>148<br>211 | 246<br>280<br>297<br>378 | 128'147.90<br>971.10<br>5'601.65<br>1'659.15 | AU<br>NA<br>NA<br>NA | 05.07.19<br>26.08.19<br>18.09.19<br>07.12.19 | 55'000.00<br>35'000.00<br>35'000.00<br>f 15'000.00 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |     |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA      |         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                 |                                 |                                                                      |                                                          |                            |                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 223   | Blitzschutz<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 5'000                           | 5'000                           |                                                                      |                                                          |                            |                                                      |
| 224   | Bedachungsarbeiten<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 89'000<br>71'000<br>18'000      | 54'000<br>54'000                | 65'575.60<br>47'896.45<br>17'679.15                                  |                                                          |                            | 46'649.15<br>34'249.15<br>12'400.00                  |
| 224.0 | Deckungen (Steildächer)<br>WIH<br>22400 BKP 224.0 Deckungen (Steildächer)<br>Mohn & Partner AG<br>2 Nachtrag prov. Abdichtung<br>3 Abdichtung TH-Fassade<br>4 Nachtrag GFB TH-Fassade<br>2. Akonto / 19248<br>Schlussrechnung / 19502<br>neue Abdichtungen / 19718<br>Glasfaserbetonschwelle / 4191200606 | 53<br>73<br>76<br>97        | 89'000<br>71'000                | 54'000<br>54'000                | 65'575.60<br>47'896.45<br>32'221.35 AU<br>7'476.00 NA<br>8'199.10 NA |                                                          |                            | 46'649.15<br>34'249.15                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 150<br>210<br>216<br>312        | 300<br>375<br>383<br>524        |                                                                      | 23.09.19<br>13.12.19<br>21.12.19<br>31.03.20             | AC<br>SR<br>RC<br>RC       | 6'500.00<br>f 11'250.70<br>7'566.85<br>8'931.60      |
|       | BIB<br>22400 BKP 224.0 Deckungen (Steildächer)<br>Mohn & Partner AG<br>1 Abdecken Bibliothek (aus 112)<br>2 Nachtrag prov. Abdichtung<br>1. Akonto / 1/19212<br>Schlussrechnung / 19502                                                                                                                   | 39<br>73                    | 18'000                          |                                 | 17'679.15<br><br>* 8'062.30 NA<br>9'616.85 NA                        |                                                          |                            | 12'400.00                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 116<br>210                      | 244<br>376                      |                                                                      | 02.07.19<br>13.12.19                                     | AC<br>SR                   | 12'400.00<br>f                                       |
| 225   | Spezielle Dichtungen und Dämmungen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 60'500<br>50'500<br>10'000      | 37'000<br>27'000<br>10'000      | 61'810.45<br>59'510.85<br>2'299.60                                   |                                                          |                            | 59'047.45<br>53'747.85<br>5'299.60                   |
| 225.1 | Fugendichtungen<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>Fubotech AG \ Abdichtungen Fugen / 195499<br>Fubotech AG \ Fugenabdichtungen / 205712<br>Fubotech AG \ Abdichten, Fugen / 205750<br>Fubotech AG \ Abdichtung / 205818<br>Fubotech AG \ Fugenabdichtung / 205993                                          | 71<br>80<br>83<br>92<br>103 | 7'000<br>5'000                  | 7'000<br>5'000                  | 8'307.70<br>6'008.10                                                 | D                                                        |                            | 8'307.70<br>6'008.10                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 202<br>242<br>256<br>288<br>322 | 366<br>418<br>434<br>491<br>542 |                                                                      | 05.12.19<br>11.02.20<br>20.02.20<br>10.03.20<br>30.04.20 | RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC | 449.85<br>1'396.55<br>2'389.40<br>1'113.10<br>659.20 |
|       | BIB<br>99999 Direktzahlung<br>Fubotech AG \ Abdichtung / 205818                                                                                                                                                                                                                                           | 92                          | 2'000                           | 2'000                           | 2'299.60                                                             | D                                                        |                            | 2'299.60                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 288                             | 492                             |                                                                      |                                                          | 10.03.20                   | RC<br>2'000.00                                       |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |     |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA      |         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                                                |                                                           |        |                                              |                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225.1 | Fubotech AG \ Fugerdichtungen / 206652                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118                  | 357                                            | 607                                            |                                                           |        | 24.09.20                                     | 299.60                                                                                       |
| 225.2 | Spezielle Dämmungen<br>WIH<br>27100 BKP 271 Gipserarbeiten<br>Iannone & Partner AG<br>1. Akonto<br>2. Akonto Teilrechnung<br>3. Akonto Teilrechnung<br>Schlussrechnung                                                                                                                                         | 33<br>53<br>56<br>88 | 23'500<br>104<br>149<br>159<br>273             | 229<br>298<br>310<br>456                       | 41'844.05                                                 | AU     |                                              | 41'156.00                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                                                |                                                           |        | 05.06.19<br>20.09.19<br>04.10.19<br>24.02.20 | 19'386.00<br>10'770.00<br>11'000.00<br>f                                                     |
| 225.4 | Brandschutzbekleidungen und dgl.<br>WIH<br>22540 BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.<br>Brandisol AG<br>Schlussrechnung / 34469<br>99999 Direktzahlung<br>JADA Isolierungen GmbH \ Regie / 192078<br>BIB<br>22540 BKP 225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl.<br>Brandisol AG<br>Schlussrechnung / 34469 | 91<br>66<br>91       | 30'000<br>22'000<br>286<br>187<br>8'000<br>286 | 30'000<br>22'000<br>488<br>345<br>8'000<br>489 | 11'658.70<br>11'658.70<br>10'821.85<br>836.85<br>8'000.00 | A<br>D | 24.02.20<br>22.11.19                         | 9'583.75<br>6'583.75<br>5'746.90<br>f 5'746.90<br>836.85<br>836.85<br>3'000.00<br>f 3'000.00 |
| 226   | Fassadenputze<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 12'000                                         | 12'000                                         | 7'378.70                                                  |        | 24.02.20                                     | 12'111.45                                                                                    |
| 226.1 | Verputzarbeiten (äussere)<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 7'500                                          |                                                |                                                           |        |                                              |                                                                                              |
| 226.2 | Verputzte Aussenwärmedämmungen<br>WIH<br>27100 BKP 271 Gipserarbeiten<br>Iannone & Partner AG<br>Schlussrechnung                                                                                                                                                                                               | 88                   | 4'500<br>273                                   | 12'000<br>457                                  | 7'378.70                                                  | AU     | 24.02.20                                     | 12'111.45<br>f 12'111.45                                                                     |
| 227   | Äussere Oberflächenbehandlungen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 92'000<br>52'000<br>40'000                     |                                                | 10'651.55<br>10'651.55                                    |        |                                              | 11'000.00<br>11'000.00                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                |                                                |                                                           |        |                                              |                                                                                              |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                    |          | KV-Orig.                   | KV-Rev.                    | Vertrag                                                                                        | Art                  |                            | Zahlung                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                            |          |                            |                            |                                                                                                |                      |                            |                                        |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                   | VAU      | ZANW                       | BU                         |                                                                                                | R-Datum              | RA                         |                                        |
| 227.0 | Gerüste<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                          |          | 75'000<br>35'000<br>40'000 |                            |                                                                                                |                      |                            |                                        |
| 227.1 | Aeusserer Malerarbeiten<br>WIH<br>28510 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten<br>Roger Nef Malergesellschaft GmbH<br>Schlussrechnung / 491091/2020                                    | 93       | 17'000                     |                            | 10'651.55                                                                                      | A                    |                            | 11'000.00                              |
| 228   | Aeusserer Abschlüsse, Sonnenschutz<br>WIH<br>BIB                                                                                                                               |          | 40'000<br>21'500<br>18'500 | 35'000<br>20'000<br>15'000 | 28'118.95<br>18'079.15<br>10'039.80                                                            |                      | 19.03.20 SR                | f 11'000.00                            |
| 228.3 | Sonnenstoren<br>WIH<br>22800 BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz<br>Schenker Storen AG<br>1. Akonto / 784500000992                                                        | 0<br>69  | 40'000<br>21'500           | 35'000<br>20'000           | 28'118.95<br>18'079.15                                                                         | AU                   |                            | 28'536.55<br>17'230.20<br>11'306.35    |
|       | BIB<br>22800 BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz<br>Schenker Storen AG<br>1. Akonto / 784500000952                                                                        | 0<br>63  | 0<br>178                   | 623<br>360<br>15'000       |                                                                                                | SR<br>AC             | 05.12.19                   | f 3'070.20<br>14'160.00<br>11'306.35   |
| 23    | Elektroanlagen<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>WS-Skyworker AG \ Selbstfahrarbeitsbühne / 202000896                                                                           | 89       | 656'000<br>532'000         | 616'000<br>502'000         | 661'372.60<br>588'777.55                                                                       | D                    |                            | 720'435.95<br>594'418.80               |
|       | BIB<br>99999 Direktzahlung<br>Daniel Hofmann \ Glockenset & Taster<br>Elektroanlagen und Sicherheitstechnik GmbH Reto Kunz \ Internet/Telefonanschluss / R200222               | 95<br>90 | 124'000                    | 114'000                    | 72'595.05                                                                                      | D                    | 28.02.20 RC                | 463.10                                 |
| 230   | Stark+ Schwachstrom<br>WIH<br>23000 BKP 23 Elektroanlagen<br>Hans K. Schibli AG<br>1 BKP 233 Beleuchtung UG<br>3 Nachtrag 3: Pot. Ausgleich<br>5 Nachtrag 5: Steckdosen Turnh. |          | 656'000<br>532'000         | 616'000<br>502'000         | 660'388.55<br>588'314.45<br>378'881.15<br>311'685.20<br>* 6'916.70<br>* 7'439.15<br>* 1'765.70 | AU<br>NA<br>NA<br>NA | 24.03.20 RC<br>04.03.20 RC | 126'017.15<br>96.05<br>424.90          |
|       |                                                                                                                                                                                |          |                            |                            |                                                                                                |                      |                            | 719'451.90<br>593'955.70<br>431'925.65 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art     |          | Zahlung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|---------|----------|-------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                                 |     |          |         |         |         |          |             |
|     | Buchungstext                                                        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA       |             |
| 230 | 6 Nachtrag 6; Bel. Nassz. UG                                        |     |          |         |         |         |          |             |
|     | 7 Nachtrag 7: Küche                                                 |     |          |         |         |         |          |             |
|     | 8 Nachtrag 8: HV                                                    |     |          |         |         |         |          |             |
|     | 9 Nachtrag 9: Beleuchtung UG                                        |     |          |         |         |         |          |             |
|     | 10 Nachtrag 10: Storensteuerung                                     |     |          |         |         |         |          |             |
|     | 1. Konto / 50000202                                                 | 25  | 85       | 207     |         | NA      | 18.04.19 | 9'000.00    |
|     | 2. Konto / 50000231                                                 | 37  | 114      | 243     |         | NA      | 26.06.19 | 61'569.75   |
|     | 3. Konto / 50000242                                                 | 40  | 121      | 249     |         | NA      | 10.07.19 | 23'199.30   |
|     | 4. Konto / 50000251                                                 | 49  | 141      | 286     |         | NA      | 26.08.19 | 49'079.15   |
|     | TR 6. Konto / 50000280                                              | 62  | 177      | 330     |         | NA      | 30.10.19 | 65'000.00   |
|     | 7. Konto / 50000291                                                 | 68  | 195      | 355     |         | NA      | 29.11.19 | 36'906.05   |
|     | 8. Konto / 50000300                                                 | 80  | 236      | 407     |         | AC      | 18.12.19 | 77'061.65   |
|     | Teilrechnung Regie / 50000317                                       | 78  | 227      | 395     |         | RG      | 16.01.20 | 10'725.35   |
|     | 9. Konto / 50000329                                                 | 85  | 265      | 461     |         | AC      | 19.02.20 | 11'151.90   |
|     | Regie / 50000335                                                    | 96  | 306      | 516     |         | RG      | 16.03.20 | 12'698.55   |
|     | Regie / 5000351                                                     | 102 | 319      | 532     |         | RG      | 22.04.20 | 2'917.80    |
|     | Schlussrechnung / 50000353                                          | 102 | 320      | 538     |         | SR      | 22.04.20 | f 71'178.05 |
|     | Regie 22880 / 50000390                                              | 117 | 354      | 603     |         | RG      | 27.07.20 | 1'438.10    |
|     | 23001 BKP 23 Elektroanlagen: RWA-Zentrale MINIMAX                   |     |          |         |         |         |          | 13'870.95   |
|     | 1 Minderkosten ohne Velux                                           |     |          |         |         |         |          |             |
|     | Rauch- und Wärmeabzugszentrale / 1960461                            | 54  | 152      | 302     |         | NA      | 19.09.19 | 8'704.35    |
|     | Rechnung / 1961031                                                  | 0   | 0        | 646     |         | RC      | 08.10.19 | 4'518.70    |
|     | Drehflügel Bühne: Fehlersuche / 5000548                             | 81  | 254      | 433     |         | RC      | 11.02.20 | 647.90      |
|     | 23002 BKP 23 Elektroanlagen: Notfallalarmierung G + M Elektronik AG |     |          |         |         |         |          | 14'425.05   |
|     | 1. Konto / 627992/34119                                             | 68  | 196      | 356     |         | A       | 27.11.19 | 6'698.10    |
|     | SR/Notfallalarmierungsanlage / 629342/34119                         | 93  | 295      | 502     |         | SR      | 28.02.20 | f 7'726.95  |
|     | 23003 BKP 23 Elektroanlagen: Notlichtanlage Almat AG                |     |          |         |         |         |          | 21'738.30   |
|     | 1. Konto / 25045771                                                 | 72  | 207      | 373     |         | A       | 09.12.19 | 17'232.00   |
|     | Schlussrechnung / 250048590                                         | 97  | 311      | 523     |         | AC      | 30.03.20 | f 4'506.30  |
|     | 23301 BKP 233 Beleuchtung Monolicht GmbH                            |     |          |         |         |         |          | 70'898.90   |
|     | 1. Konto / 35896                                                    | 50  | 142      | 287     |         | AC      | 09.09.19 | 40'027.00   |
|     | Kabel grau / 36990                                                  | 79  | 230      | 400     |         | RC      | 21.01.20 | 322.95      |
|     | 3.Akonto Teilbetrag / 37050                                         | 79  | 229      | 398     |         | AC      | 23.01.20 | 16'027.00   |
|     | Nachtrag / 37487                                                    | 101 | 317      | 529     |         | RC      | 26.03.20 | 2'206.65    |
|     | Schlussrechnung / 37488                                             | 101 | 318      | 530     |         | SR      | 26.03.20 | f 12'315.30 |



Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | KV-Orig.                                             | KV-Rev.                      | Vertrag                                                   | Art                        | R-Datum                                                                                      | Zahlung                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                      |                              |                                                           |                            |                                                                                              |                                                                                               |
|     | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VAU                                    | ZANW                                                 | BU                           |                                                           |                            | RA                                                                                           |                                                                                               |
| 230 | 23302 BKP 233 Beleuchtung<br>Hans K. Schibli AG<br>TR 6, Akonto / 50000280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62                                     | 177                                                  | 332                          | 93'064.20<br>93'064.20                                    | A                          | 30.10.19                                                                                     | 40'775.00<br>40'775.00                                                                        |
|     | 99999 Direktzahlung<br>Visione Licht GmbH \ Deckenleuchte / 5001614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92                                     | 287                                                  | 490                          | 321.85                                                    | D                          | 09.03.20                                                                                     | 321.85<br>321.85                                                                              |
|     | BIB<br>23000 BKP 23 Elektroanlagen<br>Hans K. Schibli AG<br>3 Nachtrag 3; Pot. Ausgleich<br>4 Nachtrag 4; UV Bibliothek<br>10 Nachtrag 10; Storensteuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 124'000                                              | 114'000                      | 72'074.10<br>7'929.15                                     |                            |                                                                                              | 125'496.20<br>61'320.90                                                                       |
|     | 5. Akonto / 50000259<br>Teilrechnung Regie / 50000317<br>Schlussrechnung / 50000353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55<br>78<br>102                        | 157<br>227<br>320                                    | 307<br>396<br>539            | * 1'060.85<br>* 2'624.90<br>4'243.40                      | NA<br>NA<br>NA             |                                                                                              |                                                                                               |
|     | 23301 BKP 233 Beleuchtung<br>Monolicht GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                      |                              | 64'144.95<br>64'144.95                                    | A                          |                                                                                              | 64'175.30                                                                                     |
|     | 2. Akonto / 36380<br>Kabel transparent / 36992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62<br>79                               | 176<br>231                                           | 329<br>401                   |                                                           |                            | 30.09.19<br>16.01.20                                                                         | 21'320.90<br>10'000.00                                                                        |
|     | 3. Akonto Teilbetrag / 37050<br>Schlussrechnung / 37488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79<br>101                              | 229<br>318                                           | 399<br>531                   |                                                           |                            | 22.04.20                                                                                     | f 30'000.00                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |                              |                                                           |                            | 01.11.19<br>21.01.20<br>23.01.20<br>26.03.20                                                 | AC<br>RG<br>SR                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |                              |                                                           |                            |                                                                                              | 40'027.00<br>148.30<br>24'000.00                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |                              |                                                           |                            |                                                                                              | f                                                                                             |
| 24  | Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 620'000<br>573'000<br>47'000                         | 623'000<br>576'000<br>47'000 | 637'020.45<br>565'912.20<br>71'108.25                     |                            |                                                                                              | 647'026.95<br>584'716.95<br>62'310.00                                                         |
| 243 | Wärmeverteilung<br>WIH<br>24000 BKP 24 Heizungsanlagen<br>Hunziker Partner AG<br>1 Lieferung und IB Engaser<br>2 Ergänz. Heizung Büro Biblioth.<br>3 Anpassungen bei Bühne<br>4 Anpassungen Leitungen UG<br>1. Akonto / 18046<br>2. Akonto / 18286<br>3. Akonto / 18528<br>6. Akonto Teilrechnung / 18780<br>Heizkörper u. Zuleitung 01.04.19 / 18888<br>Heizkörper u. Zuleitung 22.08.19 / 18889<br>5. Akonto / 19160<br>Stromanschluss NT1 / 19562 | 32<br>35<br>42<br>65<br>52<br>58<br>68 | 100<br>109<br>126<br>184<br>146<br>147<br>167<br>191 | 126'000<br>108'000           | 133'868.80<br>93'664.85                                   | AU<br>NA<br>NA<br>NA<br>NA |                                                                                              | 137'583.55<br>105'273.55                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                      |                              | 79'882.65<br>8'019.45<br>1'832.35<br>2'922.60<br>1'007.80 |                            | 15.05.19<br>17.06.19<br>15.07.19<br>15.08.19<br>30.08.19<br>30.08.19<br>15.10.19<br>20.11.19 | 5'385.00<br>10'770.00<br>32'310.00<br>21'540.00<br>390.65<br>1'539.70<br>5'763.05<br>8'019.45 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP                         | Bezeichnung                                                         |        | KV-Orig. | KV-Rev.   | Vertrag    | Art      | R-Datum   | Zahlung    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
|                             | Objekt/Auftrag/Unt.                                                 |        |          |           |            |          |           |            |
|                             | Buchungstext                                                        | VAU    | ZANW     | BU        |            |          | RA        |            |
| 243                         | Heizkörper NT 2 / 19561                                             | 68     | 192      | 352       |            |          | 20.11.19  | RC         |
|                             | BHZ UG Nasszelle Leck / 19761                                       | 76     | 219      | 386       |            |          | 12.12.19  | RC         |
|                             | Anschluss Druckdifferenzleitung Heizung / 20530                     | 84     | 260      | 438       |            |          | 18.02.20  | RC         |
|                             | Heizkörper/Zuleitung demonstrieren, versetzen, anschliessen / 20528 | 84     | 261      | 439       |            |          | 18.02.20  | RC         |
|                             | Schlussrechnung / 20532                                             | 89     | 274      | 449       |            |          | 18.02.20  | SR         |
|                             | BIB                                                                 |        | 18'000   | 18'000    | 40'203.95  |          |           |            |
|                             | 24000 BKP 24 Heizungsanlagen                                        |        |          |           | 40'203.95  | AU       |           |            |
|                             | Hunziker Partner AG                                                 |        |          |           |            |          |           |            |
|                             | 6. Akonto Teilrechnung / 18780                                      | 65     | 184      | 340       |            | 15.08.19 | AC        | 10'770.00  |
|                             | 4. Akonto / 19023                                                   | 53     | 151      | 301       |            | 16.09.19 | AC        | 21'540.00  |
| Schlussrechnung / 20532     | 89                                                                  | 274    | 450      |           | 18.02.20   | SR       | f         |            |
| 244                         | Lüftungsanlagen                                                     |        | 494'000  | 497'000   | 503'151.65 |          |           | 509'443.40 |
|                             | WIH                                                                 |        | 465'000  | 468'000   | 472'247.35 |          |           | 479'443.40 |
|                             | 24400 BKP 244 Lüftungsanlagen                                       |        |          |           | 467'337.80 | AU       |           |            |
|                             | Schmid AG                                                           |        |          |           | 2'044.50   | NA       |           |            |
|                             | 1 Nachtrag 1 Abluftgitter Halle                                     |        |          |           | 1'325.95   | NA       |           |            |
|                             | 2 Nachtrag 2 Queller Bibliothek                                     |        |          |           | 1'539.10   | NA       |           |            |
|                             | 3 Nachtrag 3 Zuluft Bühne                                           |        |          |           |            |          |           |            |
|                             | 4 Nachtrag 4 Filter                                                 |        |          |           |            |          |           |            |
|                             | 1. Akonto / AK-100626                                               | 29     | 96       | 220       |            | 07.05.19 | AC        | 13'438.30  |
|                             | 2. Akonto / AK-100643                                               | 37     | 113      | 242       |            | 19.06.19 | AC        | 90'178.75  |
| 25                          | 3. Akonto / AK_100679                                               | 49     | 140      | 285       |            | 28.08.19 | AC        | 49'932.60  |
|                             | 4. Akonto / AK_100690                                               | 55     | 155      | 304       |            | 18.09.19 | AC        | 92'346.20  |
|                             | 5. Akonto / AK-100700                                               | 57     | 166      | 318       |            | 07.10.19 | AC        | 46'469.70  |
|                             | 6. Akonto Teilrechnung / AK-100715                                  | 67     | 188      | 346       |            | 12.11.19 | AC        | 42'737.65  |
|                             | 7. Akonto / AK-100740                                               | 77     | 226      | 394       |            | 20.12.19 | AC        | 56'311.45  |
|                             | 8. Akonto / AK-100768                                               | 95     | 303      | 513       |            | 25.02.20 | AC        | 29'856.40  |
|                             | Schlussrechnung / RG_115766                                         | 105    | 326      | 547       |            | 11.05.20 | SR        | f          |
|                             | BIB                                                                 |        | 29'000   | 29'000    | 30'904.30  |          |           | 30'000.00  |
|                             | 24400 BKP 244 Lüftungsanlagen                                       |        |          |           | 29'578.35  | AU       |           |            |
|                             | Schmid AG                                                           |        |          |           | 1'325.95   | NA       |           |            |
| 250                         | 2 Nachtrag 2 Queller Bibliothek                                     |        |          |           |            |          |           |            |
|                             | 6. Akonto Teilrechnung / AK-100715                                  | 67     | 188      | 347       |            | 12.11.19 | AC        | 30'000.00  |
| Schlussrechnung / RG_115766 | 105                                                                 | 326    | 548      |           | 11.05.20   | SR       | f         |            |
| 25                          | Sanitäranlagen                                                      |        | 265'000  | 244'000   | 275'133.80 |          |           | 294'281.00 |
|                             | WIH                                                                 |        | 239'500  | 218'500   | 236'849.10 |          |           | 258'651.20 |
| BIB                         |                                                                     | 25'500 | 25'500   | 38'284.70 |            |          | 35'629.80 |            |
| 250                         | Sanitäranlagen Gebäude                                              |        | 251'000  | 230'000   | 226'597.40 |          |           | 245'744.60 |
|                             | WIH                                                                 |        | 234'000  | 213'000   | 201'942.50 |          |           | 223'744.60 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |     |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA      |         |

|     |                                                                                    |     |        |        |  |    |          |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--|----|----------|-------------|
| 250 | 25000 BKP 25 Sanitäranlagen                                                        |     |        |        |  |    |          |             |
|     | Reilstab Haustechnik AG                                                            |     |        |        |  |    |          |             |
|     | 1 Anpassungen Apparateliste                                                        |     |        |        |  |    |          |             |
|     | 2 Anpassungen gegenüber WV                                                         |     |        |        |  |    |          |             |
|     | 1. Konto                                                                           | 25  | 78     | 252    |  | AU | 03.04.19 | 15'300.00   |
|     | 2. Konto                                                                           | 28  | 93     | 254    |  | AC | 03.05.19 | 21'700.00   |
|     | Rechnung Spülung                                                                   | 36  | 111    | 250    |  | RC | 05.06.19 | 37'288.60   |
|     | 3. Konto                                                                           | 35  | 108    | 256    |  | AC | 12.06.19 |             |
|     | 4. Konto                                                                           | 41  | 122    | 258    |  | AC | 09.07.19 | 11'700.00   |
|     | 5. Konto                                                                           | 59  | 170    | 322    |  | AC | 30.09.19 | 22'000.00   |
|     | 6. Konto                                                                           | 76  | 220    | 387    |  | AC | 04.12.19 | 12'800.00   |
|     | 7. Konto                                                                           | 79  | 233    | 403    |  | AC | 10.01.20 | 25'400.00   |
| 258 | 8. Konto                                                                           | 90  | 281    | 481    |  | AC | 10.03.20 | 59'800.00   |
|     | sep. Rg für gestohlene Armaturen / 2004088-5937                                    | 103 | 321    | 541    |  | RC | 27.04.20 | 2'934.75    |
|     | Schlussrechnung                                                                    | 104 | 323    | 543    |  | SR | 07.05.20 | f 14'821.25 |
|     | BIB                                                                                |     | 17'000 | 17'000 |  |    |          | 22'000.00   |
|     | 25000 BKP 25 Sanitäranlagen                                                        |     |        |        |  |    |          |             |
|     | Reilstab Haustechnik AG                                                            |     |        |        |  | AU |          |             |
|     | 1. Konto                                                                           | 25  | 78     | 253    |  | AC | 03.04.19 |             |
|     | 2. Konto                                                                           | 28  | 93     | 255    |  | AC | 03.05.19 |             |
|     | Rechnung Spülung                                                                   | 36  | 111    | 251    |  | RC | 05.06.19 | 14'500.00   |
|     | 3. Konto                                                                           | 35  | 108    | 257    |  | AC | 12.06.19 |             |
|     | 4. Konto                                                                           | 41  | 122    | 259    |  | AC | 09.07.19 |             |
|     | 5. Konto                                                                           | 59  | 170    | 323    |  | AC | 30.09.19 |             |
|     | Schlussrechnung                                                                    | 104 | 323    | 544    |  | SR | 07.05.20 | f 7'500.00  |
| 258 | Kücheneinrichtungen                                                                |     |        |        |  |    |          |             |
|     | WJH                                                                                |     | 14'000 | 14'000 |  |    |          | 48'536.40   |
|     | 99999 Direktzahlung                                                                |     | 5'500  | 5'500  |  | D  |          | 34'906.60   |
|     | Electrolux Professional AG \ Inbetriebnahme Wärmelampe / VA20002760                | 90  | 279    | 479    |  |    | 24.02.20 | 966.20      |
|     | Electrolux Professional AG \ Montage inkl. Demontage u. Wiedermontage / VA20003206 | 90  | 278    | 478    |  | RC | 28.02.20 | 19'321.20   |
|     | Total Electrolux Professional AG                                                   |     |        |        |  |    |          | (20'287.40) |
|     | MEKO (Suisse) AG \ Durchschub-Geschirrspülmaschine / 1011279                       | 0   | 0      | 540    |  | RC | 06.02.20 | 14'357.50   |
|     | Sistec Service GmbH \ AquaPurity Clean Tauschkartusche / 0158564                   | 91  | 285    | 487    |  | RC | 21.02.20 | 261.70      |
|     | BIB                                                                                |     | 8'500  | 8'500  |  | A  |          | 13'629.80   |
|     | 25800 BKP 258 Teeküche                                                             |     |        |        |  |    |          |             |
|     | Huss Schreinerei GmbH                                                              |     |        |        |  |    |          |             |
|     | Teeküche Bibliothek / 4770                                                         | 80  | 244    | 421    |  | RC | 07.02.20 | 13'629.80   |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | KV-Orig.                      | KV-Rev.                                     | Vertrag                                                                  | Art | R-Datum                                      | Zahlung                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                               |                                             |                                                                          |     |                                              |                                                                                         |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                                         | VAU                  | ZANW                          | BU                                          |                                                                          |     | RA                                           |                                                                                         |
| 26    | Transportanlagen<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 44'000<br>44'000              | 40'000<br>40'000                            | 34'101.30<br>34'101.30                                                   |     |                                              | 33'457.55<br>33'457.55                                                                  |
| 261   | Aufzüge<br>BIB<br>26100 BKP 261 Aufzüge<br>Meier + Co. AG<br>1. Akonto / AK-00192945<br>Schlussrechnung / RG-00122298<br>SIM Karte/ABO / 00122566                                                                                                                                    | 18<br>56<br>80       | 62<br>158<br>245              | 40'000<br>181<br>305<br>424                 | 34'101.30<br>AU                                                          |     | 31.01.19<br>25.09.19<br>30.01.20             | 33'457.55<br>17'050.50<br>f 16'215.90<br>191.15                                         |
| 27    | Ausbau 1<br>WfH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 613'500<br>488'500<br>125'000 | 546'500<br>413'500<br>133'000               | 574'488.85<br>463'905.75<br>110'583.10                                   |     |                                              | 662'958.40<br>533'644.65<br>129'313.75                                                  |
| 271   | Gipserarbeiten<br>WfH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 55'000<br>12'000<br>43'000    | 78'500<br>35'500<br>43'000                  | 63'773.15<br>48'705.80<br>15'067.35                                      |     |                                              | 76'434.50<br>60'389.45<br>16'045.05                                                     |
| 271.1 | Spezielle Gipserarbeiten<br>WfH<br>27100 BKP 271 Gipserarbeiten<br>Iannone & Partner AG<br>5 Nachtrag 5: andere Rev.-Deckel<br>7 Nachtrag 7: Dachuntersichten<br>8 Nachtrag: Profile und Spacht.<br>2. Akonto Teilrechnung<br>3. Akonto Teilrechnung<br>4. Akonto<br>Schlussrechnung | 53<br>56<br>66<br>88 | 149<br>159<br>185<br>273      | 259<br>311<br>442<br>458                    | 63'773.15<br>48'705.80<br>28'117.35<br>1'447.90<br>12'590.60<br>6'549.95 |     | 20.09.19<br>04.10.19<br>22.11.19<br>24.02.20 | 76'434.50<br>60'389.45<br>8'616.00<br>8'386.00<br>29'079.00<br>f 14'308.45<br>16'045.05 |
| 272   | Metallbauarbeiten<br>WfH<br>27221 BKP 272.2 Metallbau Fassade<br>Edelmann AG<br>1. Akonto / A-19,378                                                                                                                                                                                 | 68<br>88<br>60       | 194<br>273<br>171             | 43'000<br>43'000<br>15'000<br>10'000<br>324 | 15'067.35<br>7'470.25<br>1'026.65<br>6'570.45                            |     | 02.12.19<br>24.02.20                         | 14'539.50<br>f 1'505.55<br>87'113.15<br>80'976.40<br>52'644.90                          |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art     |    | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|----|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |         |    |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA |         |

|       |                                                  |     |         |         |            |          |          |             |
|-------|--------------------------------------------------|-----|---------|---------|------------|----------|----------|-------------|
| 272   | Schlussrechnung / 19.519                         | 84  | 259     | 406     |            |          | 31.01.20 | f 20'019.10 |
|       | BIB                                              |     | 24'000  | 5'000   |            |          |          | 6'136.75    |
| 272.0 | Innentüren aus Metall                            |     |         |         |            |          |          |             |
|       | WIH                                              |     | 62'000  |         |            |          |          |             |
|       | BIB                                              |     | 43'000  |         |            |          |          |             |
|       |                                                  |     | 19'000  |         |            |          |          |             |
| 272.2 | Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) |     |         |         |            |          |          |             |
|       | WIH                                              |     | 15'000  | 15'000  | 5'526.40   | A        |          | 14'449.15   |
|       | 27220 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten          |     | 10'000  | 10'000  | 5'526.40   |          |          | 8'312.40    |
|       | Urs Teucher                                      |     |         |         |            |          |          |             |
|       | Rechnung                                         | 119 | 359     | 611     |            | 01.10.20 | RC       | 8'312.40    |
|       | BIB                                              |     | 5'000   | 5'000   |            |          |          | 6'136.75    |
|       | 27220 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten          |     |         |         |            |          |          |             |
|       | Urs Teucher                                      |     |         |         |            |          |          |             |
|       | Rechnung                                         | 119 | 359     | 612     |            | 01.10.20 | RC       | 4'009.70    |
|       | Rechnung                                         | 0   | 0       | 622     |            | 06.10.20 | RC       | 2'127.05    |
| 273   | Schreinerarbeiten                                |     |         |         |            |          |          |             |
|       | WIH                                              |     | 248'000 | 240'000 | 203'631.25 |          |          | 244'918.00  |
|       | BIB                                              |     | 200'000 | 160'000 | 123'553.80 |          |          | 155'786.05  |
|       |                                                  |     | 48'000  | 80'000  | 80'077.45  |          |          | 89'131.95   |
| 273.0 | Innentüren aus Holz                              |     |         |         |            |          |          |             |
|       | WIH                                              |     | 181'500 | 161'500 | 137'674.75 | A        |          | 168'135.40  |
|       | 27300 BKP 273.0 Innentüren aus Holz              |     | 170'000 | 118'000 | 92'263.85  |          |          | 117'135.40  |
|       | Fehr AG Robert                                   |     |         |         |            |          |          |             |
|       | 1. Akonto / 2019570                              | 72  | 206     | 372     |            | 13.12.19 | AC       | 64'620.00   |
|       | Schlussrechnung / 2020047                        | 91  | 284     | 485     |            | 27.02.20 | SR       | f 51'972.20 |
|       | Regie / 2020062                                  | 90  | 280     | 480     |            | 04.03.20 | RG       | 543.20      |
|       | BIB                                              |     | 11'500  | 43'500  | 45'410.90  | A        |          | 51'000.00   |
|       | 27300 BKP 273.0 Innentüren aus Holz              |     |         |         |            |          |          |             |
|       | Fehr AG Robert                                   |     |         |         |            |          |          |             |
|       | Schlussrechnung / 2020047                        | 91  | 284     | 486     |            | 27.02.20 | SR       | f 51'000.00 |
| 273.3 | Allgemeine Schreinerarbeiten                     |     |         |         |            |          |          |             |
|       | WIH                                              |     | 66'500  | 78'500  | 65'956.50  |          |          | 76'782.60   |
|       | 27330 BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten          |     | 30'000  | 42'000  | 31'289.95  |          |          | 38'650.65   |
|       | Benno Erni GmbH                                  |     |         |         | 31'289.95  | AU       |          | 37'627.65   |
|       | 1 Handlauf Treppe Bibliothek                     |     |         |         | 38'036.40  |          |          |             |
|       | 2 Wegfallende Pos. aus WV                        |     |         |         | -9'086.05  | NA       |          |             |
|       | 3 Apothekerschränk Küche                         |     |         |         | 958.00     | NA       |          |             |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                     |     | KV-Orig.         | KV-Rev.          | Vertrag                | Art      | R-Datum  | Zahlung     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------------|----------|----------|-------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                             |     |                  |                  |                        |          |          |             |
|       | Buchungstext                                                                    | VAU | ZANW             | BU               |                        |          | RA       |             |
| 273.3 | 4 Torverkleidung<br>5 Sitzbank UG                                               | 63  | 179              | 334              | 524.40<br>857.20       | NA<br>NA | 05.11.19 | 14'000.00   |
|       | 2. Konto / 190554                                                               | 80  | 241              | 416              |                        |          | 30.01.20 | 1'475.50    |
|       | Nachtrag 4/5 WH, 1 BIB / 200035                                                 | 80  | 240              | 415              |                        |          | 13.02.20 | AC          |
|       | 4. Konto / 200147                                                               | 86  | 269              | 471              |                        |          | 25.02.20 | RC          |
|       | Schränke / 200213                                                               | 120 | 360              | 617              |                        |          | 05.10.20 | SR          |
|       | Schlussrechnung / 200214                                                        |     |                  |                  |                        |          |          | f 10'647.15 |
|       | 27331 BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten<br>Huss Schreinerei GmbH                | 80  | 244              | 423              |                        |          | 07.02.20 | RC          |
|       | Teeküche Bibliothek / 4770                                                      |     |                  |                  |                        |          |          | 1'023.00    |
|       | BIB                                                                             |     | 36'500           | 36'500           | 34'666.55<br>31'775.55 | AU       |          | 38'131.95   |
|       | 27330 BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten<br>Benno Erni GmbH                      |     |                  |                  | 34'782.25              | NA       |          | 33'849.75   |
| 274   | 1 Handlauf Treppe Bibliothek<br>2 Wegfallende Pos. aus WV                       |     |                  |                  | 1'815.25<br>-4'821.95  | NA<br>NA |          |             |
|       | 1. Konto / 190506                                                               | 58  | 168              | 320              |                        |          | 17.10.19 | AC          |
|       | 3. Konto / 190845                                                               | 68  | 193              | 353              |                        |          | 28.11.19 | AC          |
|       | Nachtrag 4/5 WH, 1 BIB / 200035                                                 | 80  | 241              | 417              |                        |          | 30.01.20 | RC          |
|       | allgem. Schreinerarbeiten / 200318                                              | 98  | 313              | 525              |                        |          | 01.04.20 | RC          |
|       | Sanierung Nachtrag / 200653                                                     | 118 | 358              | 608              |                        |          | 25.08.20 | RC          |
|       | Schlussrechnung / 200214                                                        | 120 | 360              | 618              |                        |          | 05.10.20 | SR          |
|       | 27331 BKP 273.3 Allg. Schreinerarbeiten<br>Huss Schreinerei GmbH                | 80  | 244              | 422              | 2'891.00<br>2'891.00   | A        | 07.02.20 | RC          |
|       | Teeküche Bibliothek / 4770                                                      |     |                  |                  |                        |          |          | 4'282.20    |
|       | Spezialverglasungen (innere)<br>WIH                                             |     |                  |                  | 2'730.80               | D        |          | 2'730.80    |
| 275   | 99999 Direktzahlung<br>Keller Glas AG \ Isolierglas Silverstar / 622997         | 122 | 362              | 620              |                        |          | 14.10.20 | RC          |
|       | Schliessanlagen<br>WIH                                                          |     | 80'000<br>70'000 | 40'000<br>35'000 | 39'492.45<br>32'066.55 |          |          | 54'688.90   |
|       | 27500 BKP 275 Schliessanlagen<br>Hasler + Co AG                                 |     |                  |                  | 29'397.45<br>2'669.10  | AU<br>NA |          | 44'688.90   |
|       | 1 Ausarbeitung Devi und Schemas<br>Zutrittskontrollanlage / T-1276360.2489930/0 | 22  | 72               | 194              |                        |          | 12.03.19 | RC          |
|       | Schlussrechnung / T-1596545.3217067/0                                           | 108 | 332              | 557              |                        |          | 19.06.20 | SR          |
|       | BIB                                                                             |     | 10'000           | 5'000            | 7'425.90               |          |          | 10'000.00   |
|       | 27500 BKP 275 Schliessanlagen<br>Hasler + Co AG                                 |     |                  |                  | 7'425.90               | AU       |          |             |
|       |                                                                                 |     |                  |                  |                        |          |          |             |
|       |                                                                                 |     |                  |                  |                        |          |          |             |
|       |                                                                                 |     |                  |                  |                        |          |          |             |



Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |     |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA      |         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                               |                               |                                                                                                        |                                  |          |                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275   | Schlussrechnung / 7-1596545.321706710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108 | 332                           | 558                           |                                                                                                        |                                  | 19.06.20 | f 10'000.00                                                                                                |
| 276   | Innere Abschlüsse<br>WIH<br>27601 BKP 276 Verdunkelungen Innen<br>Rüedi AG Innendekoration<br>SR/Dekoration / 20069<br><br>90301 BKP 903 Bühneneinrichtung<br>Wyss Bühnenbau AG<br>1 Nachtrag Vorhänge Foyer<br>Vorhangschienen Fenster 1/2/3 Türabdeckung / 325111<br><br>BIB<br>27601 BKP 276 Verdunkelungen Innen<br>Rüedi AG Innendekoration<br>SR/Dekoration / 20069 | 94  | 298                           | 505                           | 18'119.60<br>10'107.20<br>1'462.40<br>1'462.40<br><br>8'644.80<br>8'644.80<br><br>8'012.40<br>8'012.40 | A<br><br><br><br><br>NA<br><br>A | 24.03.20 | 18'336.95<br>10'336.95<br>1'198.60<br>f 1'198.60<br><br>9'138.35<br>9'138.35<br><br>8'000.00<br>f 8'000.00 |
| 277   | Elementwände<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94  | 298                           | 506                           |                                                                                                        |                                  | 24.03.20 |                                                                                                            |
| 277.0 | Versetzbare Elementwände<br>WIH<br>27700 BKP 277 Elementwände<br>Rosconi Systems AG<br>1 Mehrkosten Ausführung<br>1. Akonto / 20683<br>Regie / 4246<br>2. Akonto / 20778<br>Schlussrechnung / 4498<br>Servicearbeiten / 100358                                                                                                                                            |     | 150'000                       | 170'000                       | 173'874.65                                                                                             |                                  |          | 178'736.10                                                                                                 |
| 279   | Lattenverschläge<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3'500                         |                               |                                                                                                        |                                  |          |                                                                                                            |
| 28    | Ausbau 2<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 346'000<br>213'000<br>133'000 | 539'000<br>434'000<br>105'000 | 520'090.40<br>383'775.10<br>136'315.30                                                                 |                                  |          | 638'711.20<br>476'646.10<br>162'065.10                                                                     |
| 281   | Bodenbeläge<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 135'000<br>85'000<br>50'000   | 122'000<br>75'000<br>47'000   | 130'466.65<br>86'290.25<br>44'176.40                                                                   |                                  |          | 186'612.25<br>125'343.70<br>61'268.55                                                                      |
| 281.0 | Unterlagsböden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 14'000                        | 10'000                        | 4'300.60                                                                                               |                                  |          | 8'271.55                                                                                                   |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                        |          | KV-Orig.                | KV-Rev.                 | Vertrag                            | Art      |                                                    | Zahlung                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                |          |                         |                         |                                    |          |                                                    |                                                     |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                       | VAU      | ZANW                    | BU                      |                                    | R-Datum  | RA                                                 |                                                     |
| 281.0 | WIH<br>28100 BKP 281.0 Unterlagsböden<br>Dörig Unterlagsböden AG<br>1 Nachtrag UB UG<br>Ergänzung Trittschallsolation/Unterlagsböden m. Rhoplan / 2190355<br>Abschlussrechnung / 2200449           | 71<br>79 | 8'000<br>203<br>234     | 6'000<br>367<br>404     | 1'326.65<br>326.80<br>999.85       | AU<br>NA |                                                    | 3'248.85                                            |
|       | BIB<br>28100 BKP 281.0 Unterlagsböden<br>Dörig Unterlagsböden AG<br>Regie / 2190101                                                                                                                | 46       | 6'000<br>134            | 4'000<br>272            | 2'973.95<br>2'973.95               | AU       | 09.12.19<br>24.01.20<br>RC<br>RC<br>21.08.19<br>RG | 2'233.80<br>1'015.05<br>5'022.70<br>5'022.70        |
|       | Fugenlose Bodenbeläge<br>WIH<br>28110 BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge<br>Repoxit AG<br>Schlussrechnung / 9199015                                                                                   | 93       | 61'000<br>17'000<br>289 | 55'000<br>12'000<br>493 | 85'113.25<br>49'974.00<br>9'725.10 | AU       |                                                    | 118'517.40<br>75'517.40<br>23'741.80<br>f 23'741.80 |
|       | 28111 BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge (Turnhalle)<br>Walo Bertschinger AG<br>Reparaturarbeiten Wässerschaden / 310201031<br>Schlussrechnung / 310201030                                            | 95<br>95 | 304<br>305              | 514<br>515              | 40'248.90                          | AU       | 24.02.20<br>SR                                     | 51'775.60                                           |
| 281.2 | BIB<br>28110 BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge<br>Repoxit AG<br>Schlussrechnung / 9199015                                                                                                            | 93       | 44'000<br>289           | 43'000<br>494           | 35'139.25                          | AU       |                                                    | 43'000.00                                           |
|       | Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.<br>WIH<br>28120 BKP 281.2 Bodenbeläge Kunststoffe, Textilien und dgl.<br>Daniel Tschirky<br>Schmutzschleuse Eingang Treppenhaus Bühne / 202002656 | 125      | 48'000<br>369           | 45'000<br>639           | 1'005.45                           | A        | 24.02.20<br>SR                                     | f 43'000.00                                         |
|       | Bodenbeläge: Plattenarbeiten<br>WIH<br>28160 BKP 281.6 Plattenarbeiten<br>Thoro Plattenhandel GmbH<br>Rechnung / 20200045                                                                          | 84       | 7'000<br>262            | 7'000<br>440            | 10'320.00                          | A        | 27.11.20<br>RC                                     | 189.80                                              |
|       | Bodenbeläge aus Holz<br>WIH<br>28172 BKP 281.7 Bühne schleifen<br>Brunner Parkett Sewiteppich AG                                                                                                   |          | 5'000<br>5'000          | 5'000<br>5'000          | 29'727.35<br>23'664.15<br>7'944.40 |          | 21.02.20<br>RC                                     | 17'377.20<br>17'377.20                              |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |     |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA      |         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                 |                                                                   |                                                                                                         |                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 281.7 | SR / Bühne / 51365<br>Umkleide/Bühne Unterkonstruktion Bodenriemen / 51719<br><br>28173 BKP 281.7 Anbauteile Bühne schleifen<br>Brunner Parkett Sewiteppich AG<br>SR / Bühne / 51365<br><br>BIB<br>28171 BKP 281.7 Parkett Bibliothek<br>Brunner Parkett Sewiteppich AG<br>SR / 51460                                                                                                                         | 80<br>106<br><br>80<br><br>80 | 243<br>327<br><br>243<br><br>239                                | 419<br>549<br><br>420<br><br>414                                  | <br><br>15'719.75<br><br>6'063.20<br><br>                                                               | A<br><br><br>A                               | 12.02.20<br>02.06.20<br><br>12.02.20<br><br>12.02.20                             | SR<br>RC<br><br>SR<br><br>SR<br><br>f 10'000.00<br>1'004.35<br><br>18'006.10<br>f 18'006.10<br><br>13'245.85<br>f 13'245.85 |
| 282   | Wandbeläge, Wandbekleidungen<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | 8'000                                                           | 8'000                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |
| 282.4 | Wandbeläge: Plattenarbeiten<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 8'000                                                           | 8'000                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |
| 283   | Deckenbekleidungen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | 99'000<br>44'000<br>55'000                                      | 313'000<br>278'000<br>35'000                                      | 318'963.30<br>240'034.65<br>78'928.65                                                                   |                                              |                                                                                  | 340'753.95<br>261'881.40<br>78'872.55                                                                                       |
| 283.2 | Deckenbekleidungen aus Gips<br>BIB<br>28320 BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips<br>Jost Deckenbau AG<br>1. Akonto / 19210<br>Schlussrechnung / 19252                                                                                                                                                                                                                                                        | 57<br>70                      | 165<br>201                                                      | 317<br>361                                                        | <br><br>25'544.55                                                                                       | AU                                           | 16.10.19<br>04.12.19                                                             | 25'872.55<br><br>20'000.00<br>f 5'872.55                                                                                    |
| 283.4 | Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen<br>WIH<br>28340 BKP 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen<br>Jost Deckenbau AG<br>1 Nachtrag 1: rauchdichte Schich<br>3 Nachtrag 3: Leuchtenboxen<br>4 Nachtrag 4.1: Bühnenscheinwerf<br>101 Antrag 1<br>102 Antrag 2<br>1. Akonto / 19211<br>2. Akonto / 19229<br>3. Akonto Teilrechnung / 19720<br>Schlussrechnung / 20015<br>Regie / 20027 | 57<br>63<br>72<br>81<br>84    | 15'000<br>13'000<br><br><br><br>164<br>180<br>208<br>251<br>263 | 240'000<br>238'000<br><br><br><br>316<br>335<br>368<br>408<br>447 | 258'939.40<br>205'555.30<br><br>180'409.80<br>18'661.35<br>1'497.10<br>1'767.35<br>2'081.30<br>1'138.40 | <br><br><br>AU<br>NA<br>NA<br>NA<br>NA<br>NA | <br><br><br><br><br><br>16.10.19<br>11.11.19<br>12.12.19<br>03.02.20<br>24.02.20 | 274'364.70<br>221'364.70<br><br><br><br><br><br>50'000.00<br>50'000.00<br>94'000.00<br>f 26'709.70<br>655.00                |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | KV-Orig.                                              | KV-Rev.                                                 | Vertrag                            | Art | R-Datum                                                  | Zahlung                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                       |                                                         |                                    |     |                                                          |                                                                                  |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                   | VAU                          | ZANW                                                  | BU                                                      |                                    |     | RA                                                       |                                                                                  |
| 283.4 | BIB<br>28340 BKP 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen<br>Jost Deckenbau AG<br>3. Akonto Teilrechnung / 19720<br>Schlussrechnung / 20015                                                                                                       | 72<br>81                     | 2000<br>208<br>251                                    | 2'000<br><br>369<br>409                                 | 53'384.10<br>53'384.10             | AU  | 12.12.19<br>03.02.20                                     | 53'000.00<br>f                                                                   |
| 283.6 | Deckenbekleidungen aus Metall: Paneele und Lamellen<br>WIH<br>28360 BKP 283.6 Deckenbekleidungen aus Metall<br>Deckenbauer AG<br>1. Akonto / 201901048<br>2. Akonto / 201902093<br>Regie / 201902094<br>Schlussrechnung / 202000430<br>Regie / 202001443       | 42<br>76<br>76<br>100<br>121 | 31'000<br><br>125<br>224<br>225<br>316<br>361         | 40'000<br><br>262<br>392<br>393<br>528<br>619           | 34'479.35                          | AU  |                                                          | 40'516.70<br><br>21'540.00<br>11'254.70<br>504.20<br>f 6'396.05<br>821.75        |
| 285   | Innere Oberflächenbehandlungen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                   |                              | 72'000<br>55'000<br>17'000                            | 64'000<br>52'000<br>12'000                              | 28'891.60<br>21'069.80<br>7'821.80 |     |                                                          | 56'153.95<br>44'229.95<br>11'924.00                                              |
| 285.1 | Innere Malerarbeiten<br>WIH<br>28510 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten<br>Roger Nef Malergeschäft GmbH<br>1. Akonto / 187989/2019<br>2. Akonto Teilrechnung / 2211023/2019<br>3. Akonto / 121054/2020<br>Schlussrechnung / 491091/2020<br>Rechnung / 2001242/2020 | 56<br>66<br>79<br>93<br>0    | 72'000<br>55'000<br><br>160<br>186<br>228<br>290<br>0 | 64'000<br>52'000<br><br>312<br>344<br>397<br>496<br>628 | 28'891.60<br>21'069.80<br><br>A    |     | 01.09.19<br>21.11.19<br>23.01.20<br>19.03.20<br>13.11.20 | 56'153.95<br>44'229.95<br><br>10'770.00<br>22'310.00<br>10'770.00<br>f<br>379.95 |
|       | BIB<br>28510 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten<br>Roger Nef Malergeschäft GmbH<br>2. Akonto Teilrechnung / 2211023/2019<br>Schlussrechnung / 491091/2020                                                                                                          | 66<br>93                     | 17'000<br><br>186<br>290                              | 12'000<br><br>343<br>497                                | 7'821.80                           | A   |                                                          | 11'924.00                                                                        |
| 286   | Bauaustrocknung<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>Krüger + Co. AG \ Miete 5 Elektro-Heizlüfter / 1057894<br>Krüger + Co. AG \ Miete Wasserschaden / 1059070                                                                                                     | 79<br>95                     | 2'000<br>1'000<br><br>232<br>302                      | 2'000<br>1'000<br><br>402<br>512                        | 23'692.65<br>23'692.65             | D   | 21.11.19<br>19.03.20<br><br>16.01.20<br>28.01.20         | 23'692.65<br>23'692.65<br><br>2'085.60<br>21'607.05                              |
|       | BIB                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 1'000                                                 | 1'000                                                   |                                    |     |                                                          |                                                                                  |

**Detailausdruck inkl. MWST**

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | KV-Orig.                                                         | KV-Rev.                                         | Vertrag                                                                           | Art                                                                                 | Zahlung                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                  |                                                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VAU                                                      | ZANW                                                             | BU                                              | R-Datum                                                                           | RA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 287   | Baureinigung<br>WIH<br>28701 BKP 287 Baureinigung<br>Schluss AG Reinigungen<br><i>Schlussrechnung / 20080138</i><br><br>99999 Direktzahlung<br><i>Corti AG \ SR/Allgemeine Entsorgung / 613442</i><br><br>BIB<br>28701 BKP 287 Baureinigung<br>Schluss AG Reinigungen<br><i>Schlussrechnung / 20080138</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114<br><br>112<br><br>114                                | 30'000<br>20'000<br><br>30'000<br>20'000<br><br>30'000<br>20'000 | 347<br><br>337<br><br>589<br><br>567<br><br>590 | 18'076.20<br><i>12'687.75</i><br><i>10'026.85</i><br><br>2'660.90<br><br>5'388.45 | A<br><br>D<br><br>A<br><br>SR<br><br>RC<br><br>SR                                   | 31'498.40<br>21'498.40<br>18'837.50<br><br><i>f 18'837.50</i><br><br>2'660.90<br><i>2'660.90</i><br><br>10'000.00<br><br><i>f 10'000.00</i>                                                                                                       |
| 29    | Honorare<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | 942'600<br>706'000<br>236'600                                    | 1'217'100<br>870'500<br>346'600                 | 1'196'815.40<br><i>867'768.70</i><br><i>329'046.70</i>                            |                                                                                     | 1'221'557.85<br>866'189.40<br>355'368.45                                                                                                                                                                                                          |
| 291   | Architekt<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 609'100<br>453'100<br>156'000                                    | 803'100<br>578'600<br>224'500                   | 797'486.30<br><i>574'058.65</i><br><i>223'427.65</i>                              |                                                                                     | 773'287.50<br>547'253.85<br>226'033.65                                                                                                                                                                                                            |
| 291.1 | Schneider Gmür Arch.AG, Phase 21-33, Proj.<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>Graf Biscioni Architekten \ Honorar<br>Schneider & Gnür Architekten \ Vereinbarung<br>Schneider & Gnür Architekten \ 3+4 Akonto<br>Schneider & Gnür Architekten \ 7. Akonto<br>Schneider & Gnür Architekten \ 9. Akonto<br>Schneider & Gnür Architekten \ 2. Akonto<br>Schneider & Gnür Architekten \ 10. Akonto<br>Schneider & Gnür Architekten \ Schlussrechnung<br>Schneider & Gnür Architekten \ 12. Akonto<br>Schneider & Gnür Architekten<br>Total Schneider & Gnür Architekten<br><br>BIB<br>99999 Direktzahlung<br>Schneider & Gnür Architekten \ 5+6 Akonto<br>Schneider & Gnür Architekten \ 8. Akonto<br><i>Schneider &amp; Gnür Architekten \ Schlussrechnung</i> | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 204'100<br>153'100<br><br>51'000                                 | 204'100<br>153'100<br><br>51'000                | 186'303.40<br><i>138'203.40</i><br><br>48'100.00<br><br>D                         | D<br><br>RC<br>GS<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC | 186'303.40<br>138'203.40<br><br>11'500.00<br>-15'000.00<br>21'600.00<br>10'800.00<br>10'800.00<br>16'200.00<br>10'800.00<br>13'780.80<br>55'817.60<br>1'905.00<br><i>(126'703.40)</i><br><br>48'100.00<br><br>21'600.00<br>10'800.00<br>15'700.00 |
| 291.2 | RLC Arch.AG, Phase 41-53 Ausf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | 405'000                                                          | 416'500                                         | 447'874.30                                                                        |                                                                                     | 426'915.50                                                                                                                                                                                                                                        |

|     |                     |     |          |         |         |         |         |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag |         | Zahlung |
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         | Art     |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA      |

[illegible]

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | KV-Orig.                                                              | KV-Rev.                                                                                           | Vertrag                                                                                                           | Art                                                     | R-Datum                                                                                                                                  | Zahlung                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VAU                                                                   | ZANW                                                                  | BU                                                                                                |                                                                                                                   |                                                         | RA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 291.3 | 3. Teilrechnung Honorar / 21/7/2016<br>29103 Architekt, Kostenstelle QS Brandschutz<br>RLC Architekten AG<br>Gesamtleitung Brandschutz / 183/2020<br>29106 Architekt, Kostenstelle Zusatzleistungen/Nachtrag 1<br>RLC Architekten AG<br>Teilrechnung Aufwand / 170/2015<br>Teilrechnung Aufwand / 018/2016<br>Honorar Architekt Zusatzleistungen / 029/2017<br>BIB<br>29101 Architekt, Kostenstelle Vor- und Bauprojekt<br>RLC Architekten AG<br>Schlussrechnung / 037/2017<br>29103 Architekt, Kostenstelle QS Brandschutz<br>RLC Architekten AG<br>Gesamtleitung Brandschutz / 183/2020<br>29105 Architekt, Kostenstelle Urnenabstimmung Bibliothek<br>RLC Architekten AG<br>Honorar Infoveranstaltung Bibliothek / 134/2017<br>29106 Architekt, Kostenstelle Zusatzleistungen/Nachtrag 1<br>RLC Architekten AG<br>Schlussrechnung / 037/2017 | 0<br><br>124<br><br>0<br>0<br>0<br><br>0<br><br>124<br><br>0<br><br>0 | 0<br><br>364<br><br>0<br>0<br>0<br><br>0<br><br>364<br><br>0<br><br>0 | 124<br><br>629<br><br>120<br>127<br>126<br><br>57'000<br><br>125<br><br>630<br><br>129<br><br>128 | <br><br>1'615.50<br><br>52'434.00<br><br>55'259.10<br>17'463.60<br><br>1'615.50<br><br>14'580.00<br><br>21'600.00 | A<br><br>A<br><br>A<br><br>A<br><br>A<br><br>A<br><br>A | <br><br>22.12.17<br><br>18.11.20<br><br>30.11.15<br>23.02.16<br>01.03.17<br><br>27.03.17<br><br>18.11.20<br><br>29.09.17<br><br>27.03.17 | 16'200.00<br><br>1'615.50<br><br>f 1'615.50<br><br>54'000.00<br><br>18'986.40<br>8'176.35<br>26'837.25<br><br>50'453.10<br>17'463.60<br><br>f 17'463.60<br><br>1'615.50<br><br>f 1'615.50<br><br>14'580.00<br><br>f 14'580.00<br><br>16'794.00<br><br>f 16'794.00 |
| 292   | Bauingenieur<br>WfH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 29'500<br><br>29'500                                                  | 61'500<br><br>61'500                                                                              | 61'440.00<br>6'462.00<br>54'978.00                                                                                |                                                         |                                                                                                                                          | 88'499.65<br>6'462.00<br>82'037.65                                                                                                                                                                                                                                |
| 292.1 | Schnewlin+Küttel AG, Phase 41-53 Ausf.RLC<br>BIB<br>29210 Bauingenieur, Ausführung<br>Schnewlin + Küttel AG<br>Honorar / 051<br>Honorar 1.10.-31.03.2019 / 159<br>Honorar 1.4.-19-31.10.19 / 244<br>Honorar 11.11.-19-31.1.20 / 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2<br>25<br>118<br>118                                                 | 30<br>81<br>355<br>356                                                | 10'000<br><br>10'000                                                                              | 9'800.70<br><br>A                                                                                                 |                                                         | 30.09.18<br>29.03.19<br>11.11.19<br>23.09.20                                                                                             | 27'582.00<br><br>2'870.20<br>7'728.55<br>16'521.20<br>462.05                                                                                                                                                                                                      |
| 292.2 | Krattiger Ing.AG. Phase 31-33, Proj.<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | 7'000                                                                 | 7'000                                                                                             | 7'560.00                                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                          | 15'278.00                                                                                                                                                                                                                                                         |



| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag |         | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         | Art     |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |                        |                                                  |   |                                              |                      |                                                                                                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292.2 | 29201 Holzbauingenieur, Bauprojekt<br>Krattinger Engineering AG<br><br>1. Akonto / 2017/205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0<br>1              | 0<br>32                | 675<br>118                                       | A | 20.09.14<br>25.10.18                         | RC<br>AC             | 6'912.00<br>8'366.00                                                                                                                                                               |
| 292.3 | Krattinger Ing.-AG, Phase 41-53 Ausf.RLC<br>WIH<br>29220 Holzbauingenieur, Bauprojekt + Ausführung<br>Krattinger Engineering AG<br>Teilzahlung 2. Akonto / 2019/097<br>Teilrechnung 4. Akonto / 2019/159<br><br>BIB<br>29220 Holzbauingenieur, Bauprojekt + Ausführung<br>Krattinger Engineering AG<br>Bauprojekt/Ausschreibung/Phase2 / 2018/240<br>Teilzahlung 2. Akonto / 2019/087<br>3. Akonto-Rechnung / 2019/145<br>Teilrechnung 4. Akonto / 2019/159 |  | 31<br>50            | 98<br>143              | 33'500<br>222<br>288                             | A | 16.05.19<br>04.09.19                         | AC<br>AC             | 33'279.30<br>6'462.00<br><br>5'385.00<br>1'077.00<br><br>26'817,30                                                                                                                 |
| 292.4 | Schnewlin+Küttel AG, Phase 31-33, Proj.<br>BIB<br>29202 Bauingenieur, Bauprojekt<br>Schnewlin + Küttel AG<br>Leistungen März 2016 bis Februar 2017 / 078                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 8<br>31<br>41<br>50 | 49<br>99<br>123<br>143 | 11'000<br>105                                    | A | 28.11.18<br>16.05.19<br>15.07.19<br>04.09.19 | RC<br>AC<br>AC<br>AC | 12'360.35<br>12'360.35<br><br>91'988.80<br>78'841.30<br>13'147.50<br><br>21'988.80<br>19'072.80<br><br>601.55<br>10'692.00<br>4'111.55<br>3'667.70<br><br>2'916.00<br><br>2'916.00 |
| 293   | Elektroingenieur<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1                   | 23                     | 86'500<br>72'500<br>14'000                       |   | 25.10.17                                     | RC                   |                                                                                                                                                                                    |
| 293.1 | K. Bachmann AG, Phase 31-33 Proj.<br>WIH<br>29301 Elektroingenieur, Bauprojekt<br>Kurt Bachmann AG<br><br>Elektroingenieur / 01/17/442.01<br>Elektroingenieur / 01/5/17/442.01<br><br>BIB<br>29301 Elektroingenieur, Bauprojekt<br>Kurt Bachmann AG                                                                                                                                                                                                         |  | 0<br>0<br>1<br>1    | 0<br>0<br>24<br>25     | 10'500<br>10'500<br><br>660<br>666<br>106<br>107 | A | 20.11.14<br>10.12.14<br>11.01.17<br>16.03.17 | RC<br>RC<br>RC<br>RC |                                                                                                                                                                                    |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | KV-Orig.                   | KV-Rev.                    | Vertrag                             | Art     |             | Zahlung                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                            |                            |                                     |         |             |                                      |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                                              | VAU | ZANW                       | BU                         |                                     | R-Datum | RA          |                                      |
| 293.2 | K. Bachmann AG, Phase 41-53 Ausf.RLC<br>WIH<br>29300 Elektroingenieur, Ausführung<br>Kurt Bachmann AG<br>1. Akonto / 061/18/442.01<br>2. Akonto / 076/18/442.01<br>3. Akonto / 014/19/442.01<br>5. Akonto / 036/19/442.01<br>6. Akonto / 043/19/442.01<br>Schlussrechnung / 018/20/442.01 | 6   | 69'500<br>57'000           | 71'000<br>57'000           | 70'000.00<br>59'500.00              | A       |             | 70'000.00<br>59'768.50               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159 | 39                         |                            |                                     |         | 20.11.18 AC | 9'800.70                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14  | 57                         |                            |                                     |         | 20.12.18 AC | 2'584.80                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29  | 95                         |                            |                                     |         | 10.05.19 AC | 14'324.10                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57  | 163                        |                            |                                     |         | 09.10.19 AC | 7'754.40                             |
| 293.3 | BIB<br>29300 Elektroingenieur, Ausführung<br>Kurt Bachmann AG<br>4. Akonto / 028/19/442.01<br>7. Akonto / 057/19/442.01<br>Schlussrechnung / 018/20/442.01                                                                                                                                | 64  | 183                        |                            |                                     |         | 08.11.19 AC | 5'061.90                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112 | 341                        |                            |                                     |         | 22.07.20 SR | f 20'242.60                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 12'500                     | 14'000                     | 10'500.00                           | A       |             | 10'231.50                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46  | 133                        |                            |                                     |         | 20.08.19 AC | 6'246.60                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76  | 217                        |                            |                                     |         | 20.12.19 AC | 3'984.90                             |
| 294   | HLKK-Ingenieur<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                              | 112 | 341                        |                            |                                     |         | 22.07.20 SR | f                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5'000                      | 5'000                      | 4'846.50                            | A       |             |                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 103'500<br>96'000<br>7'500 | 108'000<br>98'500<br>9'500 | 100'624.55<br>93'336.95<br>7'287.60 |         |             | 119'523.80<br>112'023.80<br>7'500.00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 18'000<br>17'000           | 18'000<br>17'000           | 18'284.20<br>18'284.20<br>12'026.90 | A       |             | 36'643.85<br>36'643.85<br>30'446.35  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   | 0                          | 707                        |                                     |         | 20.01.15 RC | 17'789.75                            |
| 294.1 | Heiz.Lüft. Müller+Pletscher,Phase 31-33 Proj.<br>WIH<br>29401 Lüftungsingenieur, Bauprojekt<br>M. Pletscher GmbH<br>Honorar<br>1. Akonto Phase 31+32 / 078/1530<br>2. Akonto / 071/1530<br>Regie / 072/1530<br>Schlussrechnung / 037/1530                                                 | 1   | 19                         | 101                        |                                     |         | 15.12.16 AC | 8'800.00                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 20                         | 102                        |                                     |         | 28.11.17 AC | 2'475.20                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 21                         | 103                        |                                     |         | 28.11.17 RG | 631.80                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115 | 350                        | 596                        |                                     |         | 20.08.20 SR | f 749.60                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                            |                            | 3'000.00                            | A       |             | 2'940.20                             |
|       | 29402 Lüftungsingenieur, CAD-Bestandespläne<br>M. Pletscher GmbH<br>Honorar / 067/1530                                                                                                                                                                                                    | 8   | 45                         | 163                        |                                     |         | 30.11.18 RC | 2'940.20                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                            |                            | 3'257.30                            | A       |             | 3'257.30                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 22                         | 104                        |                                     |         | 19.12.16 RC | 3'257.30                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                            |                            |                                     |         |             |                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                            |                            |                                     |         |             |                                      |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |     |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA      |         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                      |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294.1 | BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1'000                                                                                     | 1'000                                                                                         |                                                                                                      |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 294.2 | Heiz. A. Müller GmbH,Phase 41-53 Ausf.RLC<br>WIH<br>29400 Heizungsingenieur, Ausführung<br>Andreas Müller GmbH<br>Honorar Teilrechnung / 48/1556<br>Honorar / 19/1556<br>Honorar Teilrechnung / 76/1556<br>Honorar / 30/1556<br><br>BIB<br>29400 Heizungsingenieur, Ausführung<br>Andreas Müller GmbH<br>Honorar Teilrechnung / 76/1556                                                                                                                                           | 6<br>30<br>67<br>108                  | 22'500<br>19'000<br>40<br>97<br>189<br>331<br><br>3'500<br><br>189                        | 21'500<br>17'500<br>156<br>221<br>348<br>556<br><br>4'000<br><br>349                          | 19'200.00<br>16'155.00<br><br><br><br><br>3'045.00<br><br><br><br>A<br><br><br><br>A                 |   | 15.11.18 RC<br>18.05.19 RC<br>23.11.19 RC<br>15.06.20 RC<br><br><br><br>23.11.19 RC                                                     | 20'919.60<br>17'419.60<br><br>6'371.50<br>6'871.25<br>2'802.60<br>1'374.25<br><br>3'500.00<br><br>3'500.00                                         |
| 294.3 | Heiz. A.Müller GmbH,Ph. 41-53 CAD-Best.PI.<br>WIH<br>29400 Heizungsingenieur, Ausführung<br>Andreas Müller GmbH<br>Honorar Teilrechnung / 48/1556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67                                    | 2'500                                                                                     | 4'500                                                                                         | 4'100.00                                                                                             | A |                                                                                                                                         | 2'500.00                                                                                                                                           |
| 294.4 | Lüft. M. Pletscher GmbH,Ph. 41-53 Ausf.RLC<br>WIH<br>29405 Lüftungsingenieur, Ausführung<br>M. Pletscher GmbH<br>1 Zusatzleistungen Foyer/Küche<br>Honorar Brandschutzmassnahmen / 068/1530<br>SR Honorar NT1 / 070/1530<br>1. Akonto / 069/1530<br>2. Akonto / 007/1530<br>3. Akonto / 072/1530<br>Schlussrechnung / 036/1530<br>Zeitrarif Brandschutzmassnahmen / 038/1530<br><br>BIB<br>29405 Lüftungsingenieur, Ausführung<br>M. Pletscher GmbH<br>Schlussrechnung / 036/1530 | 8<br>8<br>8<br>25<br>74<br>115<br>115 | 57'500<br>54'500<br><br>44<br>46<br>47<br>84<br>213<br>351<br>352<br><br>3'000<br><br>351 | 64'000<br>59'500<br><br>162<br>164<br>165<br>206<br>380<br>597<br>599<br><br>4'500<br><br>598 | 59'040.35<br>54'797.75<br><br>51'157.50<br>3'640.25<br><br><br><br>4'242.60<br>4'242.60<br><br><br>A |   | 15.11.18 RC<br>30.11.18 RC<br>30.11.18 AC<br>29.03.19 AC<br>18.12.19 AC<br>20.08.20 SR<br>20.08.20 RG<br><br>4'000.00<br><br>f 4'000.00 | 59'460.35<br>55'460.35<br><br>1'400.10<br>3'640.25<br>15'900.00<br>17'000.00<br>8'700.00<br>f 8'400.00<br>420.00<br><br>4'000.00<br><br>f 4'000.00 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art     |    | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|----|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |         |    |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA |         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                              |                            |                                    |                                  |                                                                |                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 294.5 | Lüft. M.Pletscher GmbH,Ph.41-53 CAD.Best.PI<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 3'000                        |                            |                                    |                                  |                                                                |                                                              |
| 295   | Sanitäringenieur<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 76'500<br>61'500<br>15'000   | 78'500<br>68'000<br>10'500 | 75'928.50<br>67'312.50<br>8'616.00 |                                  |                                                                | 76'791.35<br>71'551.35<br>5'240.00                           |
| 295.1 | Hunziker Betatech AG, Ph. 31-33 Proj.<br>WIH<br>29501 Sanitäringenieur, Bauprojekt<br>Hunziker Betatech AG<br>Honorarschlussrechnung                                                                                                                                                                                          | 0                         | 11'000                       | 5'000                      | 4'308.00                           |                                  |                                                                | 10'692.00<br>7'452.00                                        |
|       | BIB<br>29501 Sanitäringenieur, Bauprojekt<br>Hunziker Betatech AG<br>1. Akonto                                                                                                                                                                                                                                                | 0                         | 11'000                       | 5'000                      | 4'308.00                           | A                                | 28.11.14<br>RC                                                 | 7'452.00<br>3'240.00                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                         | 0                            | 671                        |                                    | 10.10.14<br>RC                   |                                                                | 3'240.00                                                     |
| 295.2 | Hunziker Betatech AG, Ph.41-53, Ausf.RLC<br>WIH<br>29500 Sanitäringenieur, Ausführung<br>Hunziker Betatech AG<br>Honorar Subventionen Brandschutz<br>1. Teilrechnung Honorar Sanitär / 32458<br>2. Teilrechnung Honorar / 33120/0654.60/Technik<br>3. Teilrechnung Honorar / 33245<br>Schlussrechnung / 35990/0654.60/Technik | 1<br>9<br>21<br>76<br>114 | 18<br>50<br>70<br>222<br>349 | 44'000<br>41'000           | 43'080.00<br>40'926.00             | A                                |                                                                | 43'092.00<br>41'092.00                                       |
|       | BIB<br>29500 Sanitäringenieur, Ausführung<br>Hunziker Betatech AG<br>Schlussrechnung / 35990/0654.60/Technik                                                                                                                                                                                                                  |                           | 2'500                        | 3'000                      | 2'154.00                           | A                                | 30.11.17<br>30.11.18<br>28.02.19<br>20.12.19<br>23.07.20<br>SR | 4'320.00<br>16'155.00<br>10'770.00<br>5'385.00<br>f 4'462.00 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114                       | 349                          | 595                        |                                    | 23.07.20<br>SR                   |                                                                | 2'000.00<br>f 2'000.00                                       |
| 295.3 | Hunziker Betatech AG, Ph. 41-53 CAD-Best.PI.<br>WIH<br>29500 Sanitäringenieur, Ausführung<br>Hunziker Betatech AG<br>2. Teilrechnung Honorar / 33129/0654.12/Bau<br>Schlussrechnung / 35989/0654.12/Bau                                                                                                                       |                           | 7'500                        | 7'500                      | 7'000.50                           | A                                |                                                                | 5'897.55                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21<br>114                 | 71<br>349                    | 193<br>591                 |                                    | 28.02.19<br>23.07.20<br>TR<br>SR |                                                                | 5'897.55<br>f                                                |
| 295.4 | Hunziker Betatech AG, Ph. 41-53 Fachkoord.<br>WIH<br>29500 Sanitäringenieur, Ausführung<br>Hunziker Betatech AG                                                                                                                                                                                                               |                           | 19'000<br>17'500             | 22'000<br>19'500           | 21'540.00<br>19'386.00             | A                                |                                                                | 17'109.80<br>17'109.80                                       |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |                | KV-Orig.                   | KV-Rev.                    | Vertrag                             | Art | R-Datum                          | Zahlung                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------------|
|        | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                          |                |                            |                            |                                     |     |                                  |                                     |
|        | Buchungstext                                                                                                                                                                                 | VAU            | ZANW                       | BU                         |                                     |     | RA                               |                                     |
| 295.4  | 1. Teilrechnung Honorar Bestand und FK / 32456<br>3. Konto / 34132<br>Schlussrechnung / 35989/0654.12/Bau                                                                                    | 9<br>56<br>114 | 51<br>161<br>348           | 169<br>313<br>592          |                                     |     | 26.11.18<br>30.09.19<br>23.07.20 | TR<br>AC<br>SR                      |
|        | BIB<br>29500 Sanitäringenieur, Ausführung<br>Hunziker Betatech AG<br>Schlussrechnung / 35989/0654.12/Bau                                                                                     |                | 1'500                      | 2'500                      | 2'154.00                            | A   |                                  | 10'313.35<br>5'924.10<br>f 872.35   |
|        |                                                                                                                                                                                              | 114            | 348                        | 593                        |                                     |     | 23.07.20                         | SR<br>f                             |
| 296    | Spezialisten<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                   |                | 35'500<br>21'900<br>13'600 | 79'500<br>52'900<br>26'600 | 78'605.55<br>54'368.10<br>24'237.45 |     |                                  | 71'466.75<br>50'057.10<br>21'409.65 |
| 296.3  | Bauphysiker<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                    |                | 11'000<br>5'800<br>5'200   | 21'500<br>10'800<br>10'700 | 20'383.80<br>10'292.85<br>10'090.95 |     |                                  | 20'465.85<br>10'274.70<br>10'191.15 |
| 296.31 | Bauph. Mühlebach P. Ph. 31-33 Proj.<br>WIH<br>29601 Bauphysiker/Akustiker, Bauprojekt<br>mühlebach partner ag<br>Beratungen<br>1. Konto / 12989/104737                                       | 0<br>1         | 5'000<br>1'300             | 10'500<br>2'800            | 10'260.00<br>2'700.00               | A   |                                  | 14'011.10<br>5'971.55               |
|        | BIB<br>29601 Bauphysiker/Akustiker, Bauprojekt<br>mühlebach partner ag<br>Honorar akustische+bauphysikalische Beratung / 12989/106185                                                        |                | 3'700                      | 7'700                      | 7'560.00                            | A   | 29.06.15<br>16.12.16             | RC<br>AC                            |
|        |                                                                                                                                                                                              | 10             | 52                         | 170                        |                                     |     | 16.11.18                         | RC                                  |
| 296.32 | Bauph. Mühlebach P. Ph. 41-53 Ausf.RLC<br>WIH<br>29632 Bauphysiker/Akuster, Ausführung<br>mühlebach partner ag<br>akut. + bauphys. Beratung Honorar / 12989/106385<br>Honorar / 12989/107317 |                | 6'000<br>4'500             | 11'000<br>8'000            | 10'123.80<br>7'592.85               | A   |                                  | 6'454.75<br>4'303.15                |
|        | BIB<br>29632 Bauphysiker/Akuster, Ausführung<br>mühlebach partner ag<br>Honorarnote 05.04.-20.06.2019                                                                                        | 19<br>97       | 63<br>310                  | 184<br>522                 | 2'530.95                            | A   | 13.02.19<br>30.03.20             | RC<br>RC                            |
|        |                                                                                                                                                                                              |                | 1'500                      | 3'000                      |                                     |     |                                  | 2'593.70<br>1'709.45                |
|        |                                                                                                                                                                                              | 73             | 212                        | 379                        |                                     |     | 24.06.19                         | RC                                  |
| 296.7  | Brandsch. Mühlebach Ph. 31-33 Proj.<br>WIH<br>29602 Brandschutzfachmann, Zeitaufwand                                                                                                         |                |                            | 28'500<br>22'000           | 28'576.35<br>22'096.35<br>13'824.00 | A   |                                  | 21'358.75<br>16'223.55<br>10'060.85 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                   |                 | KV-Orig.          | KV-Rev.             | Vertrag                     | Art | R-Datum                          | Zahlung                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                           |                 |                   |                     |                             |     |                                  |                                              |
|       | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                  | VAU             | ZANW              | BU                  |                             |     | RA                               |                                              |
| 296.7 | mühlebach partner ag<br>1. Akonto / 12989B/104738<br>TR / Auflagebereinigung und Konzeptanpass. / 12989B/106807                                                                                                               | 1<br>46         | 27<br>136         | 109<br>274          |                             |     | 16.12.16<br>09.08.19             | 8'060.85<br>2'000.00                         |
|       | 29603 Brandschutzfachmann, Festhonorar<br>mühlebach partner ag<br>Brandschutz 09.01.-23.02.18 / 105624                                                                                                                        | 1               | 29                | 111                 | 3'240.00<br>A               |     | 16.04.18                         | 865.10<br>865.10                             |
|       | 29604 Brandschutzfachmann, Festhonorar<br>Balzer Ingenieure AG<br>Honorar Phase 3 / 15247                                                                                                                                     | 1               | 5                 | 144                 | * 5'032.35<br>A             |     | 21.01.16                         | 5'297.60<br>5'297.60                         |
|       | BIB<br>29602 Brandschutzfachmann, Zeitaufwand<br>mühlebach partner ag<br>2. Akonto / 12989/105203<br>TR / Auflagebereinigungspl. und Konzeptanpass. / 12989B/106807                                                           | 1<br>46         | 28<br>136         | 6'500<br>110<br>275 | 6'480.00<br>4'320.00<br>A   |     | 08.09.17<br>09.08.19             | 5'135.20<br>3'240.45<br>1'363.25<br>1'877.20 |
|       | 29604 Brandschutzfachmann, Festhonorar<br>Balzer Ingenieure AG<br>Honorar Phase 3 / 15396                                                                                                                                     | 1               | 6                 | 145                 | * 2'160.00<br>A             |     | 22.04.16                         | 1'894.75<br>1'894.75                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                     |                             |     |                                  | 25'413.95<br>20'642.85                       |
| 296.8 | Brandsch.Balzer Ing.AG. Ph.41-53 Ausf.RLC<br>WIH                                                                                                                                                                              |                 | 20'000<br>15'000  | 25'000<br>19'000    | 25'417.20<br>19'062.90<br>A |     |                                  |                                              |
|       | 29680 Brandschutzfachmann, Ausführung<br>mühlebach partner ag<br>Honorar Ausschrei/Ausführungspl. 25.10.18-03.07.19 / 12989B/106808<br>Honorar Brandschutz / 12989D/107075<br>SR/Honorar Brandschutz Phase 54 / 12989B/107456 | 46<br>69<br>107 | 135<br>197<br>329 | 273<br>357<br>554   |                             |     | 09.08.19<br>04.12.19<br>11.06.20 | 9'366.65<br>8'045.20<br>3'231.00             |
|       | BIB<br>29680 Brandschutzfachmann, Ausführung<br>mühlebach partner ag<br>Honorar Brandschutz Phasen 52/53 / 12989B/107455                                                                                                      |                 | 5'000             | 6'000               | 6'354.30<br>A               |     |                                  | 4'771.10                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                               | 107             | 330               | 555                 |                             |     | 11.06.20                         | 4'771.10                                     |
| 296.9 | Lichtkonzept P. Meier, Ph. 31-33 Proj.<br>WIH                                                                                                                                                                                 |                 | 4'500<br>1'100    | 4'500<br>1'100      | 4'228.20<br>2'916.00<br>D   |     |                                  | 4'228.20<br>2'916.00                         |
|       | 99999 Direktzahlung<br>Meier Priska \ Lichtplanung                                                                                                                                                                            | 0               | 0                 | 654                 |                             |     | 26.06.15                         | 2'916.00                                     |
|       | BIB<br>99999 Direktzahlung<br>Meier Priska \ Lichtplanung                                                                                                                                                                     |                 | 3'400             | 3'400               | 1'312.20<br>D               |     |                                  | 1'312.20                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                               | 0               | 0                 | 655                 |                             |     | 20.09.14                         | 1'312.20                                     |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | KV-Orig.                    | KV-Rev.                       | Vertrag                                 | Art                                          | Zahlung                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                             |                               |                                         |                                              |                                                                        |
|     | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                          | VAU                      | ZANW                        | BU                            |                                         | R-Datum                                      | RA                                                                     |
| 4   | Umgebung<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 20'000<br>20'000            | 20'000<br>20'000              | 61'215.75<br>61'215.75                  |                                              | 73'216.45<br>73'216.45                                                 |
| 42  | Gartenanlagen<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 10'000<br>10'000            | 10'000<br>10'000              | 61'215.75<br>61'215.75                  |                                              | 73'216.45<br>73'216.45                                                 |
| 421 | Gärtnerarbeiten<br>WIH<br>42100 BKP 421 Gärtnerarbeiten<br>Gubler Gartenbau<br>1. Akonto / RE-01943<br>Geröllstreifen aufheben, Natursteinpflasterung / RE-02005<br>SR/Fluchtwegflächen plästern, Rabatten anpassen / RE-02019<br>Rabatte / Betonfundament / RE-02247 | 83<br>94<br>94<br>111    | 10'000                      | 10'000                        | 61'215.75<br>19'190.85                  | A                                            | 73'216.45<br>31'191.55                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 257<br>297<br>296<br>335 |                             | 435<br>504<br>503<br>561      |                                         | 20.02.20<br>19.03.20<br>24.03.20<br>29.06.20 | 10'000.00<br>7'477.30<br>f 8'837.85<br>4'876.40                        |
|     | 99999 Direktzahlung<br>Corti AG \ SR/Umgebungsarbeiten / 613441<br>Corti AG \ SR/Umgebungsbeleuchtung / 613443<br>Total Corti AG<br>First Internet GmbH \ Ringgummimatte / 4500032158<br>Gemeinde Wiesendangen \ Schulhausvorplatz                                    | 112<br>112<br>25<br>0    | 338<br>339<br>80<br>0       | 568<br>569<br>202<br>726      | 42'024.90                               | D                                            | 42'024.90<br>1'312.60<br>6'302.05<br>(7'614.65)<br>189.50<br>34'220.75 |
| 47  | Kleinere Kunstbauten<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 10'000<br>10'000            | 10'000<br>10'000              |                                         |                                              |                                                                        |
| 475 | Werkleitungen und Kanalisationen<br>WIH                                                                                                                                                                                                                               |                          | 10'000                      | 10'000                        |                                         |                                              |                                                                        |
| 5   | Baunebenkosten und Uebergangskonten<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                     |                          | 173'400<br>80'200<br>93'200 | 289'400<br>112'700<br>176'700 | -147'281.20<br>-164'565.55<br>17'284.35 |                                              | -124'741.60<br>-145'953.50<br>21'211.90                                |
| 50  | Wettbewerbskosten<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 3'100<br>2'300<br>800       | 3'100<br>2'300<br>800         |                                         |                                              |                                                                        |
| 501 | Architekturwettbewerbe<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 3'100<br>2'300<br>800       | 3'100<br>2'300<br>800         |                                         |                                              |                                                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                             |                               |                                         |                                              |                                                                        |



| BKP | Bezeichnung         | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Zahlung    |
|-----|---------------------|----------|---------|---------|------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |          |         | Art     |            |
|     | Buchungstext        | VAU      | ZANW    | BU      | R-Datum RA |

[illegible]

**Detailausdruck inkl. MWST**

[illegible]

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art     |    | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|----|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |         |    |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA |         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 48'500<br>36'000<br>12'500                                                                                                          | 48'500<br>36'000<br>12'500                                                                                                                                           | 6'086.35<br>5'648.85<br>437.50 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 28'625.95<br>24'260.90<br>4'365.05                                                                                                                                                                                                                                |
| 524 | Vervielfältigungen, Plankopien<br>WIH<br>52403 Vervielfältigungen, Plankopien<br>RLC Architekten AG<br>Nebenkosten bis 25.09.2017 / 135/2017<br>Nebenkosten 01.01.-31..10.2018 / 147/2018<br>Nebenkosten 01.11. - 31.12.2018 / 201/2018<br>Nebenkosten 01.01.-30.04.2019 / 062/2019<br>Nebenkosten 01.05. - 31.10.2019 / 178/2019<br><br>52401 Vervielfältigungen, Plankopien<br>Truninger AG Eduard<br>Projekttraum aufsetzen<br>Grosskopien / 1621755<br>Plots / 1701674<br>Plots / 1706835<br>Plots / 1715245<br>Plots / 1801502<br>Plots / 1815589<br>Plots / 182802<br>Plots / 1824904<br>Plots / 1828418<br>Rechnung / 1828047<br>Plots / 1830360<br>Plots / 1835114<br>Plots / 1901678<br>Plots / 1904620<br>Plots / 695003<br>Plot / 1911213<br>Rechnung / 1913837<br>Plots / 1921140<br>Plots / 1923333<br>Plots / 1930975<br>Plots / 1929924<br>Plots / 2029197<br><br>52402 Vervielfältigungen, Plankopien<br>Rohner + Spiller AG<br>Bestandespläne kopieren / 869340 | 0<br>3<br>15<br>26<br>61                                                                                                        | 40'000<br>30'000                                                                                                                    | 40'000<br>30'000                                                                                                                                                     | 4'301.85<br>3'864.35           | 29.09.17<br>31.10.18<br>31.12.18<br>30.04.19<br>31.10.19                                                                                                                                                                                                                         | TR<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC                                                                                                                   | 26'400.95<br>22'035.90<br>9'574.60                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>4<br>16<br>16<br>19<br>21<br>24<br>0<br>0<br>44<br>52<br>63<br>64<br>126 | 0<br>4<br>7<br>8<br>9<br>12<br>14<br>16<br>17<br>36<br>0<br>60<br>59<br>65<br>68<br>77<br>0<br>0<br>131<br>145<br>181<br>182<br>370 | 701<br>133<br>213<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>139<br>151<br>642<br>179<br>177<br>186<br>189<br>199<br>227<br>645<br>269<br>294<br>336<br>337<br>718 |                                | 12.09.16<br>10.10.16<br>07.02.17<br>07.04.17<br>11.07.17<br>08.02.18<br>10.07.18<br>07.09.18<br>01.10.18<br>07.11.18<br>07.11.18<br>06.12.18<br>31.12.18<br>07.02.19<br>07.03.19<br>04.04.19<br>08.05.19<br>07.06.19<br>07.08.19<br>06.09.19<br>08.11.19<br>08.11.19<br>31.12.20 | RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC | 8'168.65<br><br>3'240.00<br>318.30<br>192.90<br>79.15<br>185.45<br>140.65<br>70.35<br>317.90<br>222.85<br>267.50<br>55.45<br>260.70<br>762.75<br>300.00<br>290.50<br>556.15<br>55.00<br><br>366.85<br>98.65<br>107.45<br>101.35<br>178.75<br><br>428.30<br>428.30 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                  |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum  | Zahlung  |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------|-----|----------|----------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                          |     |          |         |         |     |          |          |
|     | Buchungstext                                                 | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA       |          |
| 524 | 99999 Direktzahlung                                          |     |          |         |         |     |          |          |
|     | Andreas Müller GmbH \ Planplots / 26/1556                    | 105 | 325      | 546     |         | D   | 16.05.20 | 3'864.35 |
|     | einszuerns digital GmbH & Co. KG \ Konvertierung Papier/CAD  | 0   | 0        | 706     |         |     | 30.01.14 | 413.00   |
|     | Hunziker Betatech AG \ Plots/Kopien                          | 1   | 11       | 130     |         |     | 30.11.17 | 1'298.00 |
|     | Hunziker Betatech AG \ Kopien/Plots / 35992/0654.12/Bau      | 113 | 343      | 585     |         |     | 23.07.20 | 63.60    |
|     | Hunziker Betatech AG \ Kopien/Plots / 35991/0654.60/Technik  | 113 | 344      | 586     |         |     | 23.07.20 | 57.40    |
|     | Total Hunziker Betatech AG                                   |     |          |         |         |     |          | 202.00   |
|     | Kurt Bachmann AG \ Spesen Kopien / 502/20/442.01             | 112 | 340      | 579     |         |     | 22.07.20 | (323.00) |
|     | M. Pletscher GmbH \ Plots / 073/1530                         | 1   | 10       | 131     |         |     | 28.11.17 | 751.05   |
|     | M. Pletscher GmbH \ Plots / 071/1530                         | 8   | 48       | 166     |         |     | 30.11.18 | 101.55   |
|     | M. Pletscher GmbH \ Plots / 073/1530                         | 74  | 214      | 381     |         |     | 18.12.19 | 107.20   |
|     | Total M. Pletscher GmbH                                      |     |          |         |         |     |          | 574.35   |
|     | wyss bühnenbau ag \ Digitalisierung Pläne / 324340           | 23  | 76       | 198     |         |     | 29.03.19 | (783.10) |
|     |                                                              |     |          |         |         |     |          | 296.20   |
|     | BIB                                                          |     | 10'000   | 10'000  |         |     |          | 4'365.05 |
|     | 52401 Vervielfältigungen, Plankopien                         |     |          |         |         |     |          | 2'301.55 |
|     | Truninger AG Eduard                                          |     |          |         |         |     |          |          |
|     | Plot / 1831392                                               | 12  | 54       | 172     |         |     | 06.12.18 | 128.35   |
|     | Plots / 1906336                                              | 25  | 79       | 201     |         |     | 04.04.19 | 59.35    |
|     | Plots / 1909830                                              | 28  | 94       | 218     |         |     | 03.05.19 | 228.95   |
|     | Plots / 1911564                                              | 28  | 90       | 214     |         |     | 08.05.19 | 122.50   |
|     | Kopien/Plots / 1912602                                       | 34  | 105      | 231     |         |     | 04.06.19 | 76.85    |
|     | Plots / 1914168                                              | 33  | 103      | 230     |         |     | 07.06.19 | 597.75   |
|     | Plots / 1913837                                              | 35  | 110      | 236     |         |     | 07.06.19 | 55.00    |
|     | Plots Kurt Bachmann AG / 1916060                             | 40  | 119      | 247     |         |     | 08.07.19 | 37.60    |
|     | Plot / 1917965                                               | 40  | 120      | 248     |         |     | 08.07.19 | 266.45   |
|     | Plot / 1919958                                               | 45  | 132      | 270     |         |     | 07.08.19 | 116.00   |
|     | Plots / 1924294                                              | 51  | 144      | 290     |         |     | 06.09.19 | 130.10   |
|     | Plot / 1925491                                               | 55  | 153      | 308     |         |     | 04.10.19 | 10.95    |
|     | Plots / 1927518                                              | 58  | 169      | 321     |         |     | 08.10.19 | 65.70    |
|     | Plot / 1933754                                               | 72  | 204      | 370     |         |     | 09.12.19 | 58.00    |
|     | Plot / 2001116                                               | 81  | 252      | 430     |         |     | 12.02.20 | 116.00   |
|     | Plots / 2016271                                              | 113 | 346      | 588     |         |     | 11.08.20 | 232.00   |
|     |                                                              |     |          |         |         |     |          | 1'626.00 |
|     | 52403 Vervielfältigungen, Plankopien                         |     |          |         |         |     |          |          |
|     | RLC Architekten AG                                           |     |          |         |         |     |          |          |
|     | Nebenkosten 01.11.2019 - 28.02.2020 / 014/2020               | 87  | 271      | 475     |         |     | 28.02.20 | 864.30   |
|     | Nebenkosten 01.03.-18.11.2020 / 184/2020                     | 124 | 365      | 631     |         |     | 18.11.20 | 761.70   |
|     |                                                              |     |          |         |         |     |          |          |
|     | 99999 Direktzahlung                                          |     |          |         |         | D   |          | 437.50   |
|     | Hunziker Betatech AG \ Kopien u. Plot / 999/0654.60-h        | 11  | 53       | 171     |         |     | 05.12.18 | 216.15   |
|     | Hunziker Betatech AG \ Kopien u. Plot / 999/0654.60-h        | 21  | 69       | 190     |         |     | 28.02.19 | 76.30    |
|     | Hunziker Betatech AG \ Kopien- und Plotabruch. / 999/0654.12 | 56  | 162      | 314     |         |     | 30.09.19 | 65.00    |
|     | Hunziker Betatech AG \ Kopien- und Plots                     | 76  | 221      | 388     |         |     | 20.12.19 | 80.05    |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung<br>Objekt/Auftrag/Unt.<br>Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                          |                 | KV-Orig.                                        | KV-Rev.                                           | Vertrag                                                           | Art                       | R-Datum                                      | Zahlung                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VAU             | ZANW                                            | BU                                                |                                                                   |                           | RA                                           |                                                                      |
| 525 | Dokumentation<br>WIH<br>52501 Bestandesgrundlagen<br>Hunziker Betatech AG<br><a href="#">Bestandespläne aus Archiven zusammensuchen</a><br>99999 Direktzahlung<br>Eduard Truninger AG \ Plots / 2017338<br>BIB                                                                              | 1<br><br>113    | 7'000<br>5'000<br><br>1<br><br>345<br><br>2'000 | 7'000<br>5'000<br><br>140<br><br>587<br><br>2'000 | 1'784.50<br>1'784.50<br><br>1'784.50<br><br>1'784.50<br><br>2'000 | <br><br><br>D<br><br><br> | <br><br><br>17.08.16<br><br>11.08.20<br><br> | 2'225.00<br>2'225.00<br>440.50<br>440.50<br><br>1'784.50<br>1'784.50 |
| 529 | Konvertierung Pläne Papier/CAD<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1'500<br>1'000<br>500                           | 1'500<br>1'000<br>500                             |                                                                   |                           |                                              |                                                                      |
| 53  | Versicherungen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 10'000<br>6'000<br>4'000                        | 10'000<br>6'000<br>4'000                          | 4'957.80<br>3'577.80<br>1'380.00                                  |                           |                                              | 4'957.80<br>3'577.80<br>1'380.00                                     |
| 531 | Bauzeitversicherungen<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br><a href="#">Gebäudeversicherung des Kanton ZH \ Prämienrechnung / 19-500441</a><br><a href="#">Gebäudeversicherung des Kanton ZH \ Bauzeitvers. 2020 / 202301578</a><br>BIB                                                          | <br><br>0<br>89 | 5'000<br>3'000<br><br>0<br>277<br><br>2'000     | 5'000<br>3'000<br><br>643<br>477<br><br>2'000     | 577.80<br>577.80<br><br>577.80<br><br>2'000                       | <br><br><br>D<br><br><br> | <br><br><br>15.02.19<br>28.02.20<br><br>     | 577.80<br>577.80<br><br>257.80<br>320.00                             |
| 532 | Spezialversicherungen<br>WIH<br>53200 BKP 532 Spezialversicherungen<br>Basler Versicherungen<br><a href="#">kurzfristige Vers. 01.03.2019-31.03.2020</a><br>BIB<br>53200 BKP 532 Spezialversicherungen<br>Basler Versicherungen<br><a href="#">kurzfristige Vers. 01.03.2019-31.03.2020</a> | <br><br>0       | 5'000<br>3'000<br><br>0<br><br>2'000            | 5'000<br>3'000<br><br>182<br><br>2'000            | 4'380.00<br>3'000.00<br><br>1'380.00<br><br>2'000                 | <br><br><br>A<br><br><br> | <br><br><br>24.01.19<br><br><br>             | 4'380.00<br>3'000.00<br><br>3'000.00<br>1'380.00<br><br>1'380.00     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 0<br>0                                          | 0<br>183                                          |                                                                   |                           | 24.01.19<br>RC                               | 1'380.00                                                             |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | KV-Orig.                 | KV-Rev.                  | Vertrag                           | Art                                               | R-Datum              | Zahlung                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                          |                          |                                   |                                                   |                      |                                                                                                     |
|     | Buchungstext                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VAU                   | ZANW                     | BU                       |                                   |                                                   | RA                   |                                                                                                     |
| 54  | Finanzierung ab Baubeginn<br>WIH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | -161'000<br>-161'000     | -161'000<br>-161'000     | -212'588.20<br>-212'588.20        |                                                   |                      | -212'588.20<br>-212'588.20                                                                          |
| 548 | Rückvergütungen<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG \ Schadenfall / Schaden-Nr. 202070547410<br>Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG \ Schadenfall / Schaden-Nr. 20207054710<br>Total Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG<br>Gebäudeversicherung des Kanton ZH \ Rückvergütung Wasserschaden / 19-3-01533<br>Gebäudeversicherung des Kanton ZH \ Vergütung Subventionen Brandschutz<br>Total Gebäudeversicherung des Kanton ZH | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0    | -161'000<br>-161'000     | -212'588.20<br>-212'588.20        | D<br>22.04.20<br>23.07.20<br>10.09.20<br>04.02.21 | GS<br>GS<br>GS<br>GS | -212'588.20<br>-9'032.00<br>-2'934.75<br>(-1'1966.75)<br>-31'222.45<br>-169'399.00<br>(-200'621.45) |
| 55  | Bauherrenleistungen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | 2'800<br>1'800<br>1'000  | 2'800<br>1'800<br>1'000  | 2'465.00<br>2'465.00              |                                                   |                      | 2'465.00<br>2'465.00                                                                                |
| 558 | Projektleitung, Projektbegleitung<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>Gemeinde Wiesendangen \ Aufwand Feuerpolizei<br>Gemeinde Wiesendangen \ Aufwand Feuerpolizei<br>Gemeinde Wiesendangen \ Umbuchung Fp<br>Total Gemeinde Wiesendangen<br>Gemeindeverwaltung Wiesendangen \ Umbung Aufwand Feuerpolizei<br>BIB                                                                                                                                                                            | 0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0         | 2'800<br>1'800<br>1'800  | 2'465.00<br>2'465.00              | D<br>02.05.18<br>02.05.18<br>08.01.20<br>15.01.18 | RC<br>GS<br>RC<br>RC | 212.50<br>-212.50<br>2'252.50<br>(2'252.50)<br>212.50                                               |
| 56  | Uebrige Baunebenkosten<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 14'000<br>9'200<br>4'800 | 14'000<br>9'200<br>4'800 | 10'905.80<br>6'900.95<br>4'004.85 |                                                   |                      | 10'905.80<br>6'900.95<br>4'004.85                                                                   |
| 564 | Gutachten<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 3'000<br>2'200<br>800    | 3'000<br>2'200<br>800    |                                   |                                                   |                      |                                                                                                     |
| 566 | Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>Landi Eulachthal \ Handwerkerapéro / 10011248<br>Metzgerei Kym \ Apéro<br>Metzgerei Steck & Stalder GmbH \ Bauarbeiter Mittagessen / 20013<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                | 0<br>0<br>80          | 0<br>0<br>246            | 6'000<br>4'000<br>2'000  | 7'450.25<br>4'897.75<br>2'552.50  | D<br>31.01.20<br>25.02.20<br>29.01.20             | RC<br>RC<br>RC       | 7'450.25<br>4'897.75<br>116.20<br>1'398.60<br>3'382.95<br>2'552.50                                  |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art     |    | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|----|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |         |    |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA |         |

|     |                                                                                                                          |    |                               |                               |                                  |   |          |    |                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------|----|----------------------------------|
| 566 | 99999 Direktzahlung<br><a href="#">PromoFine AG \ Duschlucher Aufrichtegeschenk / 30456</a>                              | 79 | 235                           | 405                           |                                  | D | 22.01.20 | RC | 2'552.50                         |
| 568 | Baureklame<br>WIH<br>56800 BKP 568 Baureklame<br>Albisetti Ronner GmbH<br><a href="#">Teilrechnung Bautafel / 12438</a>  | 25 | 5'000<br>3'000                | 5'000<br>3'000                | 3'455.55<br>2'003.20             | A | 29.03.19 | RC | 3'455.55<br>2'003.20             |
|     | BIB<br>56800 BKP 568 Baureklame<br>Albisetti Ronner GmbH<br><a href="#">Teilrechnung Bautafel / 12438</a>                |    | 2'000                         | 2'000                         | 1'452.35                         | A |          |    | 2'003.20<br>1'452.35             |
| 58  | Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven<br>WIH<br>BIB                                                           | 25 | 83                            | 205                           |                                  |   | 29.03.19 | RC | 1'452.35                         |
| 583 | Reserven für Unvorhergesehenes<br>WIH<br>BIB                                                                             |    | 196'000<br>142'900<br>53'100  | 312'000<br>175'400<br>136'600 |                                  |   |          |    |                                  |
| 6   | Brandschutz<br>WIH                                                                                                       |    | 90'000<br>90'000              | 90'000<br>90'000              |                                  |   |          |    |                                  |
| 64  | Entrauchung<br>WIH                                                                                                       |    | 90'000<br>90'000              | 90'000<br>90'000              |                                  |   |          |    |                                  |
| 644 | Entrauchung MRWA<br>WIH                                                                                                  |    | 90'000                        | 90'000                        |                                  |   |          |    |                                  |
| 7   | Mehrkosten Projektüberarbeitung<br>WIH<br>BIB                                                                            |    | 287'000<br>184'800<br>102'200 | 12'500<br>8'800<br>3'700      | 9'820.05<br>8'263.10<br>1'556.95 |   |          |    | 9'820.05<br>8'263.10<br>1'556.95 |
| 71  | Bewilligungen, Gebühren<br>WIH<br>BIB                                                                                    |    | 2'900<br>1'700<br>1'200       | 2'900<br>1'700<br>1'200       | 1'481.40<br>1'481.40             |   |          |    | 1'481.40<br>1'481.40             |
| 711 | Nebenkosten verrechnet BKP 511<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br><a href="#">Schneider &amp; Gmür Architekten \ Pläne</a> | 0  | 2'900<br>1'700                | 2'900<br>1'700                | 1'481.40<br>1'481.40             | D | 10.10.15 | RC | 1'481.40<br>1'481.40<br>1'481.40 |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art | R-Datum | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|-----|---------|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |     |         |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         |     | RA      |         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                              |                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 711 | BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 1'200                                     | 1'200                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                              |                                                              |
| 72  | Muster, Modelle, Vervielfältigungen<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 5'400<br>4'000<br>1'400                   | 5'400<br>4'000<br>1'400                                                             | 2'488.70<br>1'924.65<br>564.05                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                              | 2'488.70<br>1'924.65<br>564.05                               |
| 724 | Nebenkosten verrechnet BKP 524<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>Hunziker Betatech AG \ Nebenkosten<br>M. Pletscher GmbH \ Nebenkosten<br>Schneider & Gmür Architekten \ Druck/Plot Januar<br>Schneider & Gmür Architekten \ Druck/Plot Februar<br>Schneider & Gmür Architekten \ div. SCU-Plot<br>Schneider & Gmür Architekten \ Div. SCU Plot<br>Schneider & Gmür Architekten \ div. SCU-Plot<br>Total Schneider & Gmür Architekten<br>BIB<br>99999 Direktzahlung<br>Schneider & Gmür Architekten \ Druck/Plot März<br>Schneider & Gmür Architekten \ Druck/Plot April/Mai<br>Schneider & Gmür Architekten \ div. SCU-Plot | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 670<br>659<br>683<br>682<br>677<br>664<br>698<br><br>1'400<br><br>681<br>680<br>697 | 2'488.70<br>1'924.65<br><br>D<br><br><br><br>564.05<br><br>D<br><br><br><br>88.30<br>711.60<br>216.00<br>235.15<br>424.05<br>134.60<br>114.95<br>(1'124.75)<br><br>564.05<br><br>136.70<br>325.25<br>102.10 | 10.10.14<br>20.01.15<br>10.03.14<br>10.04.14<br>20.07.14<br>10.12.14<br>10.04.15<br><br>10.05.14<br>30.06.14<br>30.04.15 | RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br>RC<br><br>RC<br>RC<br>RC |                                                              |
| 75  | Bauherrenleistung<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 1'100<br>800<br>300                       | 1'100<br>800<br>300                                                                 | 1'050.00<br>800.00<br>250.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                              | 1'050.00<br>800.00<br>250.00                                 |
| 758 | Nebenkosten verrechnet BKP 558<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br>Erne Robert \ Teilrechnung Sitzungen<br>BIB<br>99999 Direktzahlung<br>Erne Robert \ Teilrechnung Sitzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                         | 0                                         | 656<br><br>300<br><br>657                                                           | 1'050.00<br>800.00<br><br>250.00<br><br>D<br><br>D<br><br>31.12.14<br><br>31.12.14                                                                                                                          | D<br><br>D<br><br>D<br><br>D                                                                                             | RC<br><br>RC<br><br>RC                                       | 1'050.00<br>800.00<br><br>800.00<br><br>250.00<br><br>250.00 |
| 76  | Übrige Baunebenkosten<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 3'100<br>2'300<br>800                     | 3'100<br>2'300<br>800                                                               | 4'799.95<br>4'057.05<br>742.90                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                              | 4'799.95<br>4'057.05<br>742.90                               |
| 767 | Anwaltskosten, Gerichtskosten<br>WIH<br>99999 Direktzahlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | 3'100<br>2'300                            | 3'100<br>2'300                                                                      | 4'799.95<br>4'057.05<br>D                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                              | 4'799.95<br>4'057.05                                         |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP   | Bezeichnung                                                                                                            |        | KV-Orig.                     | KV-Rev.           | Vertrag     | Art | R-Datum              | Zahlung              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|
|       | Objekt/Auftrag/Unt.                                                                                                    |        |                              |                   |             |     |                      |                      |
|       | Buchungstext                                                                                                           | VAU    | ZANW                         | BU                |             |     | RA                   |                      |
| 767   | Anwaltskanzlei Lindtaw<br>Baumberger Dr. iur. Xavier \ Honorar<br>BIB<br>99999 Direktzahlung<br>Anwaltskanzlei Lindtaw | 0<br>0 | 0<br>0<br>800                | 692<br>704<br>800 |             |     | 20.07.15<br>30.07.17 | 2'300.00<br>1'757.05 |
| 79    | Mehrkosten Projektüberarbeitung<br>WIH<br>BIB                                                                          | 0      | 274'500<br>176'000<br>98'500 |                   | 742.90<br>D |     | 20.07.15<br>RC       | 742.90<br>742.90     |
| 791   | Honorare Architekt<br>WIH<br>BIB                                                                                       |        | 194'000<br>125'500<br>68'500 |                   |             |     |                      |                      |
| 791.2 | RLC Arch.-AG, Phase 41, 31-33<br>WIH<br>BIB                                                                            |        | 182'500<br>125'500<br>57'000 |                   |             |     |                      |                      |
| 791.3 | Graf Biscioni Arch. AG, Phase 41, 31-33<br>BIB                                                                         |        | 11'500                       |                   |             |     |                      |                      |
| 792   | Honorare Bauingenieur<br>BIB                                                                                           |        | 19'000                       |                   |             |     |                      |                      |
| 792.1 | Schnewlin+Küttel AG, Phase 41,31-33<br>BIB                                                                             |        | 11'000                       |                   |             |     |                      |                      |
| 792.2 | Krattiger Ing. AG, Phase 41, 31-33<br>BIB                                                                              |        | 8'000                        |                   |             |     |                      |                      |
| 793   | Honorare Elektroingenieur<br>WIH<br>BIB                                                                                |        | 8'000<br>6'500<br>1'500      |                   |             |     |                      |                      |
| 793.1 | K. Bachmann AG, Phase 41, 31-33<br>WIH<br>BIB                                                                          |        | 8'000<br>6'500<br>1'500      |                   |             |     |                      |                      |
| 794   | Honorare Heizung, Lüftung<br>WIH<br>BIB                                                                                |        | 16'000<br>15'500<br>500      |                   |             |     |                      |                      |
| 794.1 | Heiz. A. Müller GmbH, Phase 41, 31-33                                                                                  |        | 3'500                        |                   |             |     |                      |                      |



Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung         |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag | Art     |    | Zahlung |
|-----|---------------------|-----|----------|---------|---------|---------|----|---------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt. |     |          |         |         |         |    |         |
|     | Buchungstext        | VAU | ZANW     | BU      |         | R-Datum | RA |         |

|       |                                                                                                                                                          |                |                               |                               |                                        |   |                |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---|----------------|----------------------------------------|
| 794.1 | WIH<br>BIB                                                                                                                                               |                | 3'000<br>500                  |                               |                                        |   |                |                                        |
| 794.2 | Lüft. M. Pletscher GmbH, Phase 41, 31-33 Proj.<br>WIH                                                                                                    |                | 12'500                        |                               |                                        |   |                |                                        |
| 795   | Honorare Sanitäringenieur<br>WIH<br>BIB                                                                                                                  |                | 5'000<br>4'500<br>500         |                               |                                        |   |                |                                        |
| 795.1 | Hunziker Betatech AG, Phase 41,31-33<br>WIH<br>BIB                                                                                                       |                | 5'000<br>4'500<br>500         |                               |                                        |   |                |                                        |
| 796   | Honorare Spezialisten<br>WIH<br>BIB                                                                                                                      |                | 32'500<br>24'000<br>8'500     |                               |                                        |   |                |                                        |
| 796.3 | Bauph. Mühlebach P. Phase 41, 31-33<br>WIH<br>BIB                                                                                                        |                | 11'000<br>8'000<br>3'000      |                               |                                        |   |                |                                        |
| 796.8 | Brandsch. Balzer Ing. AG. Phase 41, 31-33<br>WIH<br>BIB                                                                                                  |                | 21'500<br>16'000<br>5'500     |                               |                                        |   |                |                                        |
| 8     | Sanierung Abartwohnung<br>GP                                                                                                                             |                | 10'000<br>10'000              | 10'000<br>10'000              |                                        |   |                |                                        |
| 9     | Ausstattung<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                |                | 386'500<br>269'500<br>117'000 | 383'500<br>266'500<br>117'000 | 404'595.60<br>283'764.65<br>120'830.95 |   |                | 387'603.55<br>266'770.45<br>120'833.10 |
| 90    | Möbel<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                      |                | 178'000<br>63'000<br>115'000  | 365'000<br>250'000<br>115'000 | 390'459.95<br>271'626.85<br>118'833.10 |   |                | 373'306.40<br>254'473.30<br>118'833.10 |
| 901   | Garderobeneinrichtungen, Gestelle (Tr.Gestell Schr.)<br>WIH<br>99999 Direktzahlung                                                                       | 99<br>99<br>86 | 122'000<br>7'000              | 122'000<br>7'000              | 120'376.00<br>1'542.90                 | D |                | 120'376.00<br>1'542.90                 |
|       | DPD (Schweiz) AG \ Einfuhrumsatzsteuer / 46439266<br>Fabrik direkt M. Eichhorn GmbH \ Wandteckellisch / 5579457<br>Mobatime AG \ Funknebenuhr / 90409779 |                | 315<br>314<br>268             | 527<br>526<br>470             |                                        |   | RC<br>RC<br>RC | 74.45<br>724.25<br>744.20              |

**Detailausdruck inkl. MWST**

| BKP                                                  | Bezeichnung                                                  |     | KV-Orig. | KV-Rev. | Vertrag    | Art      | Zahlung     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|----------|-------------|
|                                                      | Objekt/Auftrag/Unt.                                          |     |          |         |            |          |             |
|                                                      | Buchungstext                                                 | VAU | ZANW     | BU      |            | R-Datum  | RA          |
| 901                                                  | BIB<br>99999 Direktzahlung                                   |     | 115'000  | 115'000 | 118'833.10 | D        | 118'833.10  |
|                                                      | Cairo AG Schweiz \ Mantelhaken / 20003693                    | 80  | 248      | 427     |            | 22.01.20 | RC          |
|                                                      | Cairo AG Schweiz \ Mantelhaken / 20005976                    | 81  | 253      | 431     |            | 05.02.20 | RC          |
|                                                      | Total Cairo AG Schweiz                                       |     |          |         |            |          | (715.00)    |
|                                                      | Daniel Hofmann \ Rechnung                                    | 0   | 0        | 648     |            | 07.12.19 | RC          |
|                                                      | Daniel Hofmann \ Elektronik                                  | 80  | 250      | 429     |            | 22.01.20 | RC          |
|                                                      | Daniel Hofmann \ TV                                          | 80  | 249      | 428     |            | 01.02.20 | RC          |
|                                                      | Total Daniel Hofmann                                         |     |          |         |            |          | (4'069.10)  |
|                                                      | ERBA AG \ Einrichtung / 7845                                 | 85  | 266      | 462     |            | 31.01.20 | RC          |
| 902                                                  | Huss Schreinerei GmbH \ Garderobe, Ablage, Theke etc. / 4781 | 84  | 264      | 448     |            | 21.02.20 | RC          |
|                                                      | Huss Schreinerei GmbH \ Klapptablar / 4854                   | 105 | 324      | 545     |            | 15.05.20 | RC          |
|                                                      | Huss Schreinerei GmbH \ Treppentritte Ideenreich / 4944      | 116 | 353      | 600     |            | 21.08.20 | RC          |
|                                                      | Total Huss Schreinerei GmbH                                  |     |          |         |            |          | (43'925.90) |
|                                                      | Migros Genossenschaft Zürich \ Mobiliar / 802559163          | 80  | 247      | 426     |            | 16.01.20 | RC          |
|                                                      | Susanne Schildknecht \ Kissen, Stoff, Faden Paletten         | 95  | 301      | 511     |            | 04.03.20 | RC          |
|                                                      | Sporteinrichtungen                                           |     | 15'000   | 15'000  | 16'952.45  |          | 18'456.20   |
|                                                      | WIH<br>90201 BKP 902 Sporteinrichtungen                      |     |          |         | 16'952.05  | A        | 14'962.05   |
|                                                      | Wilhelm Otto<br>1 Nachtrag Reckposten P19-11253              | 93  | 292      | 499     | 1'990.40   | NA       | 2'783.70    |
| 903                                                  | Instalationskosten / R20-03173                               | 93  | 293      | 500     |            | 14.03.20 | RC          |
|                                                      | Steckreckposten / R20-03174                                  | 93  | 294      | 501     |            | 14.03.20 | RC          |
|                                                      | Zusätzliche Arbeiten Montagen / R20-03175                    | 93  |          |         |            | 14.03.20 | RC          |
|                                                      | Bühnentechnik                                                |     | 41'000   | 228'000 | 253'131.50 |          | 234'474.20  |
|                                                      | WIH<br>90300 BKP 903 Bühnenplanung                           |     |          |         | 14'507.55  | A        | 14'507.60   |
|                                                      | Nerlich Bühnenplan                                           |     |          |         | 14'507.55  |          |             |
|                                                      | 1. Akonto / 1559-13849                                       | 39  | 117      | 245     |            | 02.07.19 | AC          |
|                                                      | 2. Akonto / 1559-13850                                       | 55  | 154      | 303     |            | 26.09.19 | AC          |
|                                                      | SR/Phase3/4/5 / 1559-13853                                   | 93  | 291      | 498     |            | 19.03.20 | SR          |
| 90301 BKP 903 Bühneneinrichtung<br>Wyss Bühnenbau AG | 2 Nachtrag Vorhang Bühne Fenster                             |     |          |         | 180'396.85 |          | 162'730.35  |
|                                                      | 1. Akonto / 324693                                           | 69  | 198      | 358     | 175'302.70 | A        | 57'492.90   |
|                                                      | 2. Akonto / 324832                                           | 86  | 287      | 469     | * 5'094.15 | NA       | 91'695.20   |
|                                                      | Schlussrechnung / 324871                                     | 95  | 299      | 508     |            | 26.11.19 | AC          |
|                                                      | Verdunkelungsvorwand Bühne rechts / 325112                   | 0   | 0        | 601     |            | 11.02.20 | AC          |
|                                                      |                                                              |     |          |         |            | 20.03.20 | SR          |
|                                                      |                                                              |     |          |         |            | 31.08.20 | RC          |
|                                                      | 90302 BKP 903 Multimedia-Anlage                              |     |          |         | 58'227.10  | A        | 2'185.40    |
|                                                      | Tschachtli AG                                                |     |          |         | 58'227.10  |          | 57'236.25   |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung<br>Objekt/Auftrag/Unt.<br>Buchungstext                                                                                                                                   |                              | KV-Orig.                               | KV-Rev.                                | Vertrag                                       | Art                           | R-Datum              | Zahlung                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                      | VAU                          | ZANW                                   | BU                                     |                                               |                               | RA                   |                                                                      |
| 903 | 1. Konto / 043797<br>Schlussrechnung / 043827                                                                                                                                        | 76<br>88                     | 218<br>272                             | 385<br>432                             |                                               |                               | 21.12.19<br>13.02.20 | AC<br>SR                                                             |
| 91  | Beleuchtungskörper<br>WIH                                                                                                                                                            |                              | 80'000<br>80'000                       |                                        |                                               |                               |                      | 17'468.15<br>f 39'768.10                                             |
| 911 | Bühnenbeleuchtung<br>WIH                                                                                                                                                             |                              | 80'000                                 |                                        |                                               |                               |                      |                                                                      |
| 92  | Textilien<br>WIH                                                                                                                                                                     |                              | 47'000<br>47'000                       |                                        |                                               |                               |                      |                                                                      |
| 921 | Vorhänge und Innendekorationsarbeiten<br>WIH                                                                                                                                         |                              | 47'000                                 |                                        |                                               |                               |                      |                                                                      |
| 93  | Geräte, Apparate<br>WIH                                                                                                                                                              |                              | 63'000<br>63'000                       |                                        |                                               |                               |                      |                                                                      |
| 932 | Beschallungsanlage<br>WIH                                                                                                                                                            |                              | 54'000                                 |                                        |                                               |                               |                      |                                                                      |
| 933 | Mobile Höranlage<br>WIH                                                                                                                                                              |                              | 9'000                                  |                                        |                                               |                               |                      |                                                                      |
| 94  | Kleininventar<br>WIH<br>BIB                                                                                                                                                          |                              | 8'500<br>6'500<br>2'000                | 8'500<br>6'500<br>2'000                | 3'990.30<br>1'992.45<br>1'997.85              |                               |                      | 4'151.80<br>2'151.80<br>2'000.00                                     |
| 941 | Signaletik<br>WIH<br>94100 BKP 941 Signaletik<br>Albisetti Ronner GmbH<br>Beschriftungen / 13049<br>BIB<br>94100 BKP 941 Signaletik<br>Albisetti Ronner GmbH<br>Beschriftung / 13049 | 83<br><br><br><br><br><br>83 | 7'000<br>5'000<br><br>2'000<br><br>258 | 7'000<br>5'000<br><br>2'000<br><br>436 | 3'990.30<br>1'992.45<br><br>1'997.85<br><br>A | A<br><br><br><br><br>19.02.20 | RC                   | 4'151.80<br>2'151.80<br><br>2'151.80<br><br>2'000.00<br><br>2'000.00 |
| 942 | Rollgerüst Betrieb<br>WIH                                                                                                                                                            | 83                           | 1'500                                  | 1'500                                  |                                               |                               | 19.02.20             | RC                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                      |                              |                                        |                                        |                                               |                               |                      |                                                                      |

Detailausdruck inkl. MWST

| BKP | Bezeichnung                                                                       |                   | KV-Orig.                                      | KV-Rev.                                       | Vertrag                                                  | Art | R-Datum        | Zahlung                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|
|     | Objekt/Auftrag/Unt.                                                               |                   |                                               |                                               |                                                          |     |                |                                                           |
|     | Buchungstext                                                                      | VAU               | ZANW                                          | BU                                            |                                                          |     | RA             |                                                           |
| 96  | Transportmittel<br>WIH                                                            |                   | 10'000<br>10'000                              | 10'000<br>10'000                              | 10'145.35<br>10'145.35                                   |     |                | 10'145.35<br>10'145.35                                    |
| 961 | Hebebühne<br>WIH<br>99999 Direktzahlung<br><a href="#">Urs Teucher \ Rechnung</a> |                   | 10'000                                        | 10'000                                        | 10'145.35                                                | D   |                | 10'145.35                                                 |
|     | PROJEKT TOTAL<br>GP<br>WIH<br>BIB                                                 | <a href="#">0</a> | 5'922'000<br>10'000<br>4'109'000<br>1'803'000 | 5'922'000<br>10'000<br>4'109'000<br>1'803'000 | 5'539'047.45<br>5'104.30<br>3'952'559.65<br>1'581'383.50 |     | 06.10.20<br>RC | 10'145.35<br>5'908'412.55<br>4'186'033.30<br>1'722'379.25 |

## 5. Fotos



Neubau/Aufstockung Bibliothek aus der Vogelperspektive



Eingangsbereich und Bibliothek von aussen



Turnhalle mit aufgefrischter Bühne und neuem Bühnenvorhang





Neue Turnhallenfassade mit Notausgängen



Neue mobile Trennwand in der Turnhalle und neue Turnhallendecke



Aufgefrischte Galerie mit natürlichem Licht der neuen Dachfenster



Neue Holzdecke im Foyer mit Beleuchtung und Lüftung





Eingangsbereich mit neuem Glasabschluss, neuen Oberflächen und neuer Beleuchtung. Nach den aktuellen Brandschutzvorschriften modernisiert.



Eingangs- und Garderobenbereich der neuen Bibliothek



Untere Ebene der Bibliothek mit Akustikdecke aus recyklierten PET-Flaschen



Obere Ebene der Bibliothek mit langer Arbeitsfläche
